

项目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

报告序号: Passadiço - 07

工程汇报

月度报告

开始时间: 2022 年 10 月 1 日, 星期六 结束时间: 2022 年 10 月 31 日, 星期一

承建方

NS Reformas, Construcción Y Trading S.L.U

当前进程

工作概述


1. 在一楼铺设混凝土结构
2. 完成地基施工
3. 完成内墙加固
4. 开始拆除一楼


工程照片



项目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

报告序号: Passadiço - 07

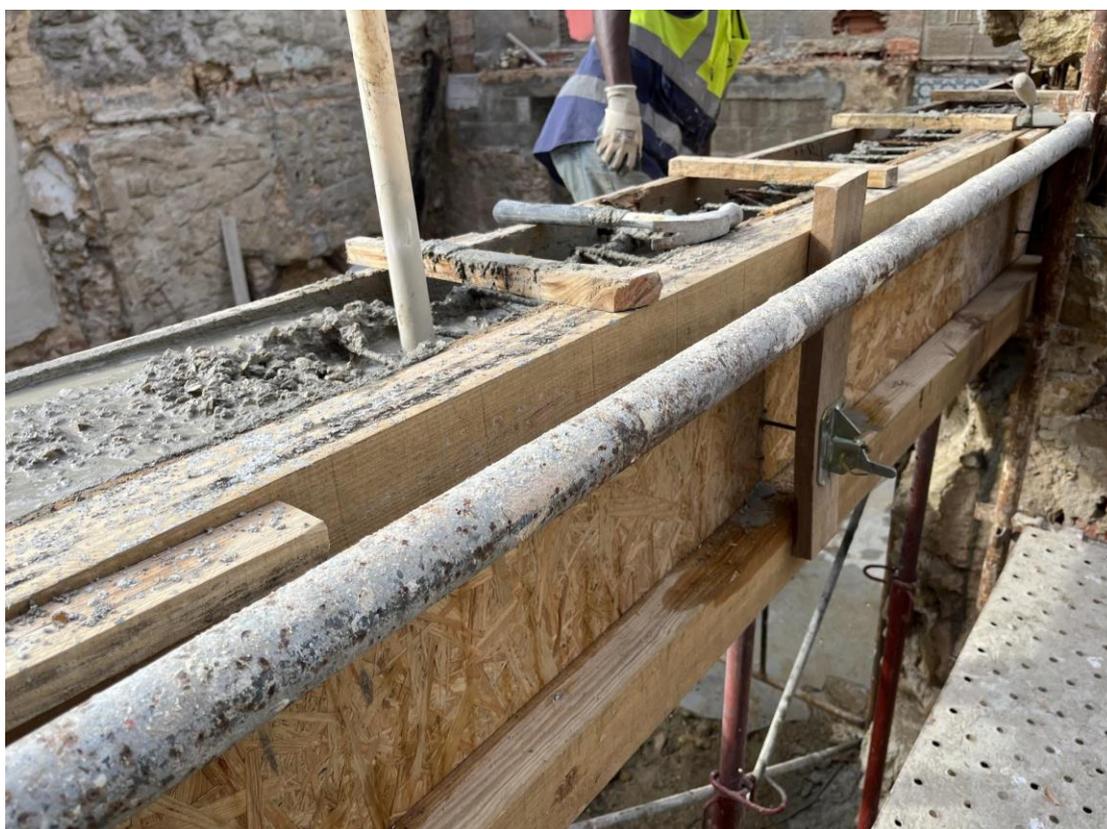

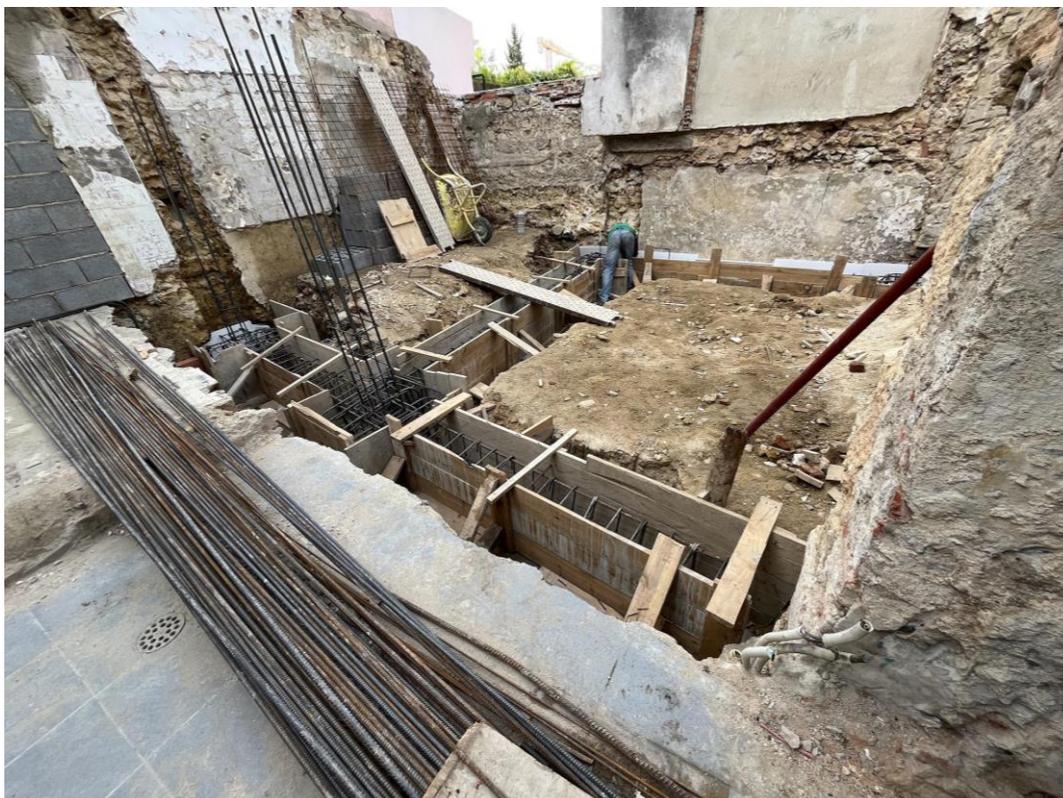



正如之前的报道中提到的，施工人员挖掘了地基，以加固新的结构基础。9月份，一层薄薄的混凝土被铺设到用作地基的地下室，之后开始逐步安装钢筋和制作木质模具，然后施工人员将混凝土倒入模具中，在10月份建造完成了地基脚。

此外，施工人员继续在封顶梁上工作。我们将混凝土浇注到模具中以建造外墙的封顶梁，以加强外墙结构并避免未来倒塌。10月下旬，我们开始在封顶梁上方组装柱子，对一楼进行结构加固。



项目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

报告序号: Passadiço - 07



项目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

报告序号: Passadiço - 07





施工人员拆除了原有立面墙体的旧石膏，然后填充墙体裂缝的空隙，并在墙壁上铺设网格，铺设钢筋石膏作为墙壁的保护。10月，我们完成了内墙的结构加固。

之后，我们开始拆除底层，并根据建筑计划进行更深的挖掘。
