

**Project:** Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

**Report Number:** Laurel - 28



**YAO TENG FGI**  
Property Development

---

## 施工進度報告

月度報告

2024 年 7 月

建築商


LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto

### 當前進程

工程概述

1. 繼續保溫放置
2. 開始放置石膏板
3. 將背板放置在地板上
4. 放置窗戶
5. 繼續鍍鋅
6. 拆除現有樓梯

### 工程照片

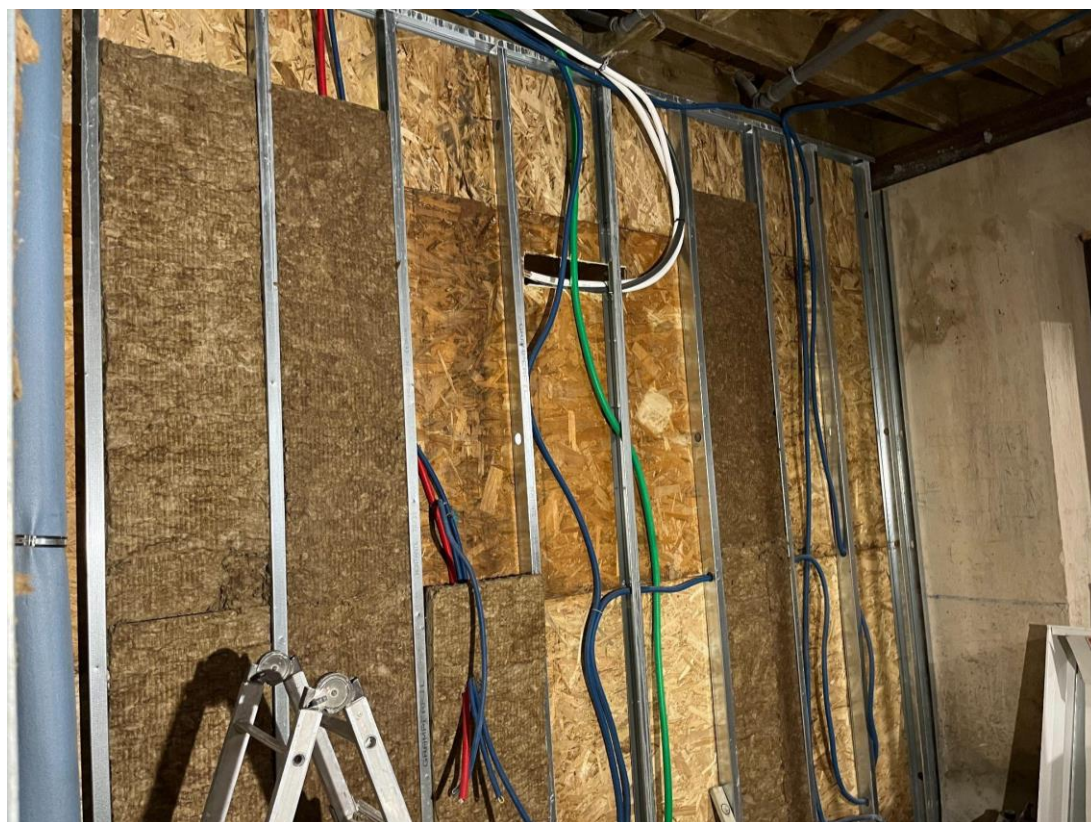
















如同六月報告所述，施工團隊正在一樓和二樓的內牆內安裝隔熱材料。七月，他們繼續這項工作，在一樓和三樓的牆壁上放置了隔熱材料。一旦基礎設施和隔熱層被第二層木鑲板包圍，他們就開始在一樓的內牆和外牆安裝石膏板。

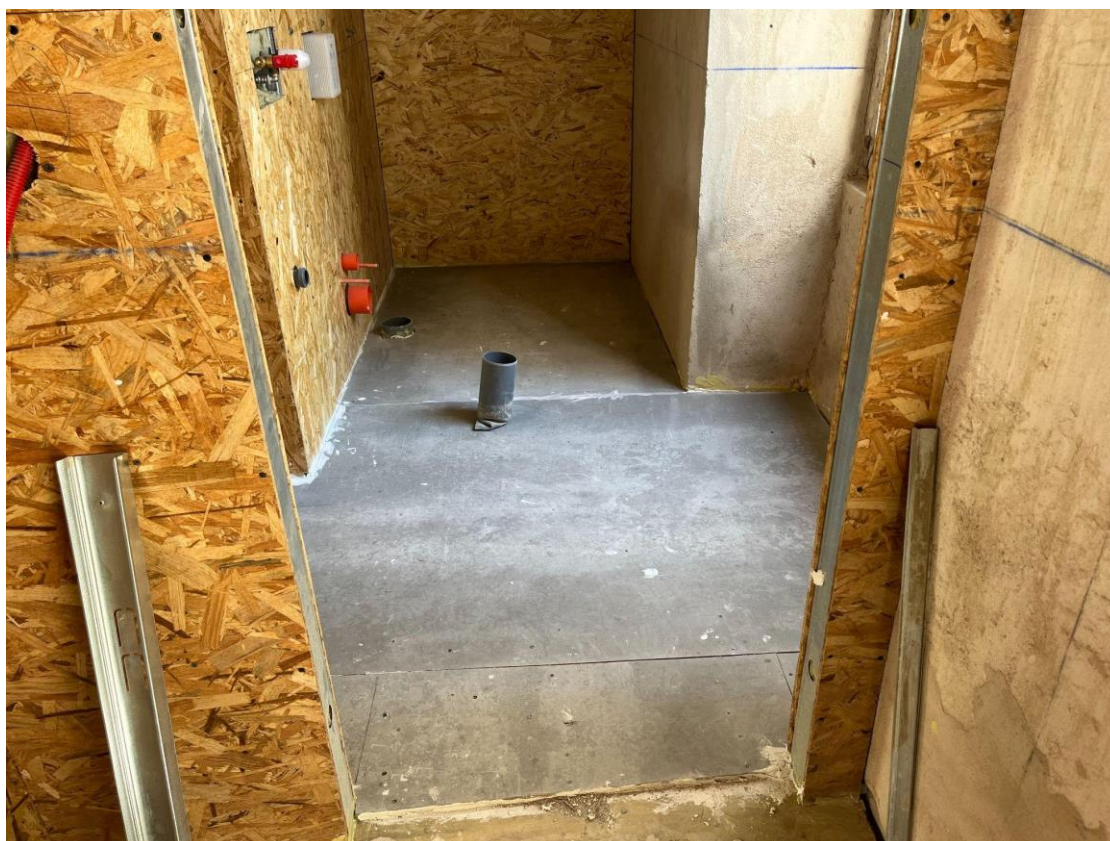











此外，他們開始在公寓廚房和浴室區域的地板上安裝背板。此背板作為可見表面下方的額外層，形成底層地板結構的一部分。它有助於提供穩定性、防止瓷磚開裂、平整表面並減少聲音。





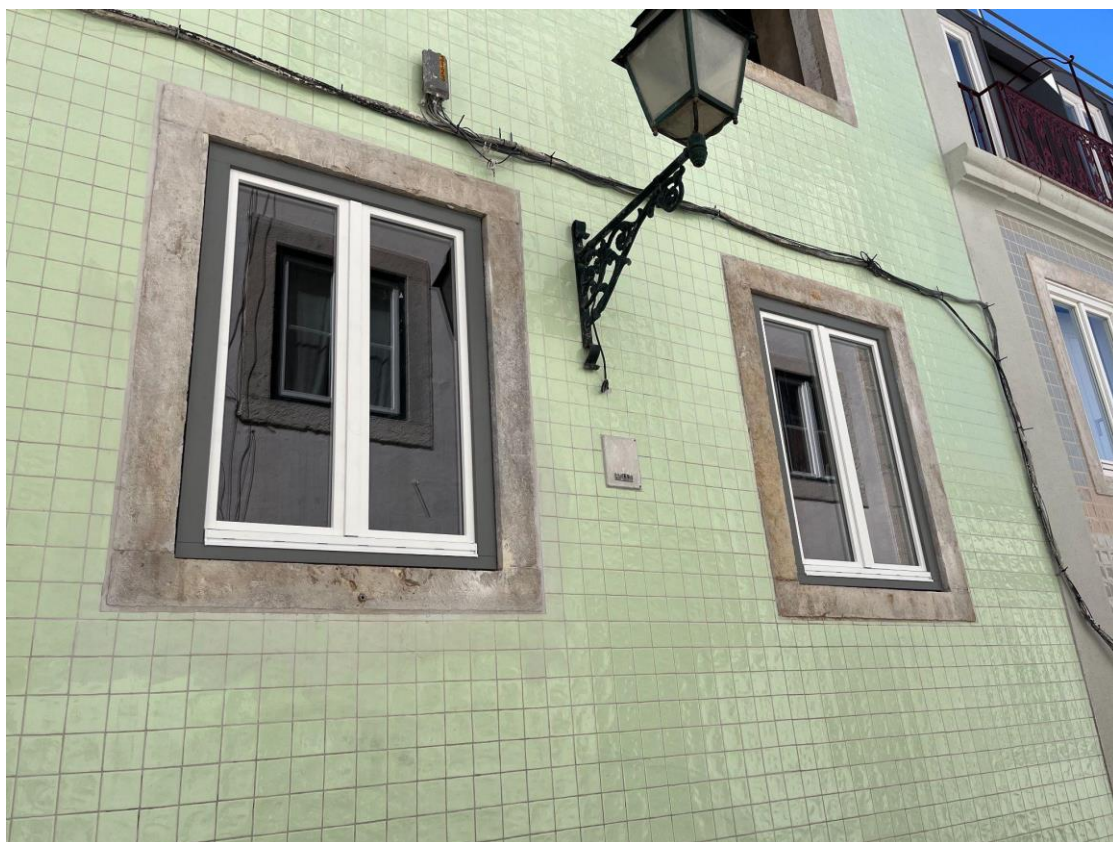

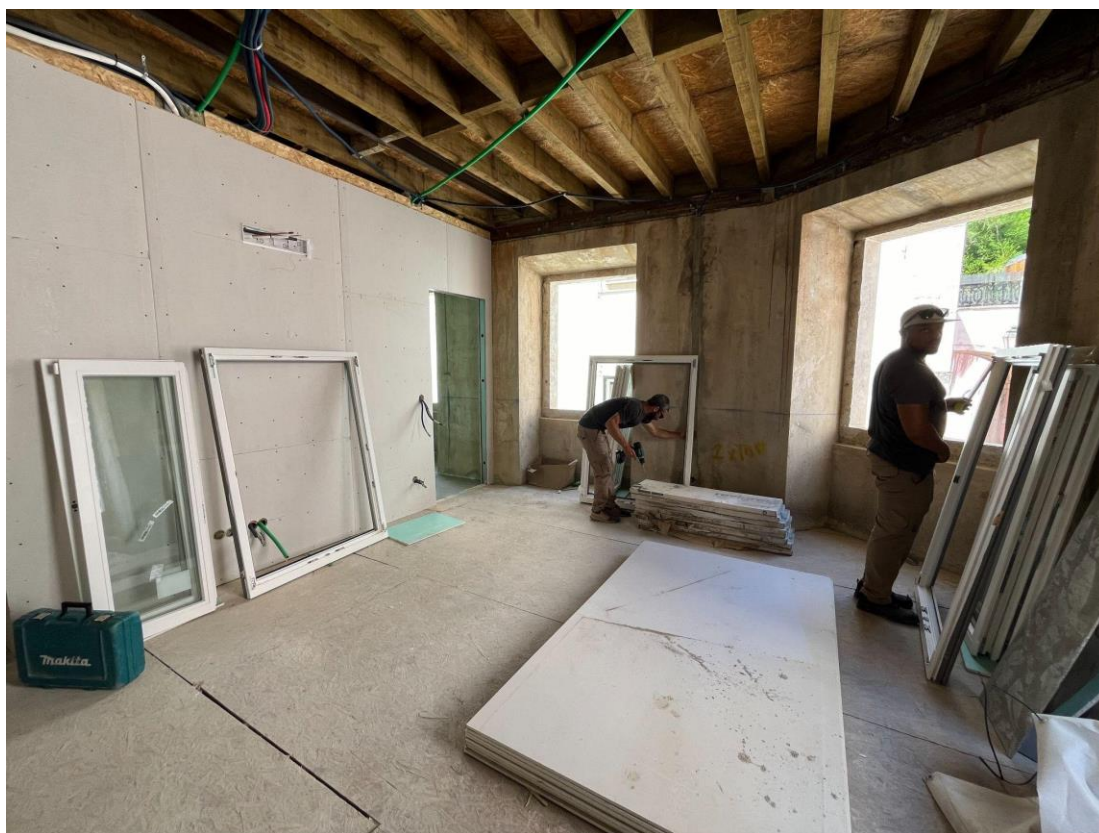

正如先前的報告所述，部分客製化窗戶已於 7 月初生產並交付到現場。施工隊已開始在一樓和三樓公寓安裝窗戶。








繼六月的工作之後，建築商繼續在面向街道的一側進行鋅覆層和屋頂瓦片的進展，並在外觀上放置隔熱材料。







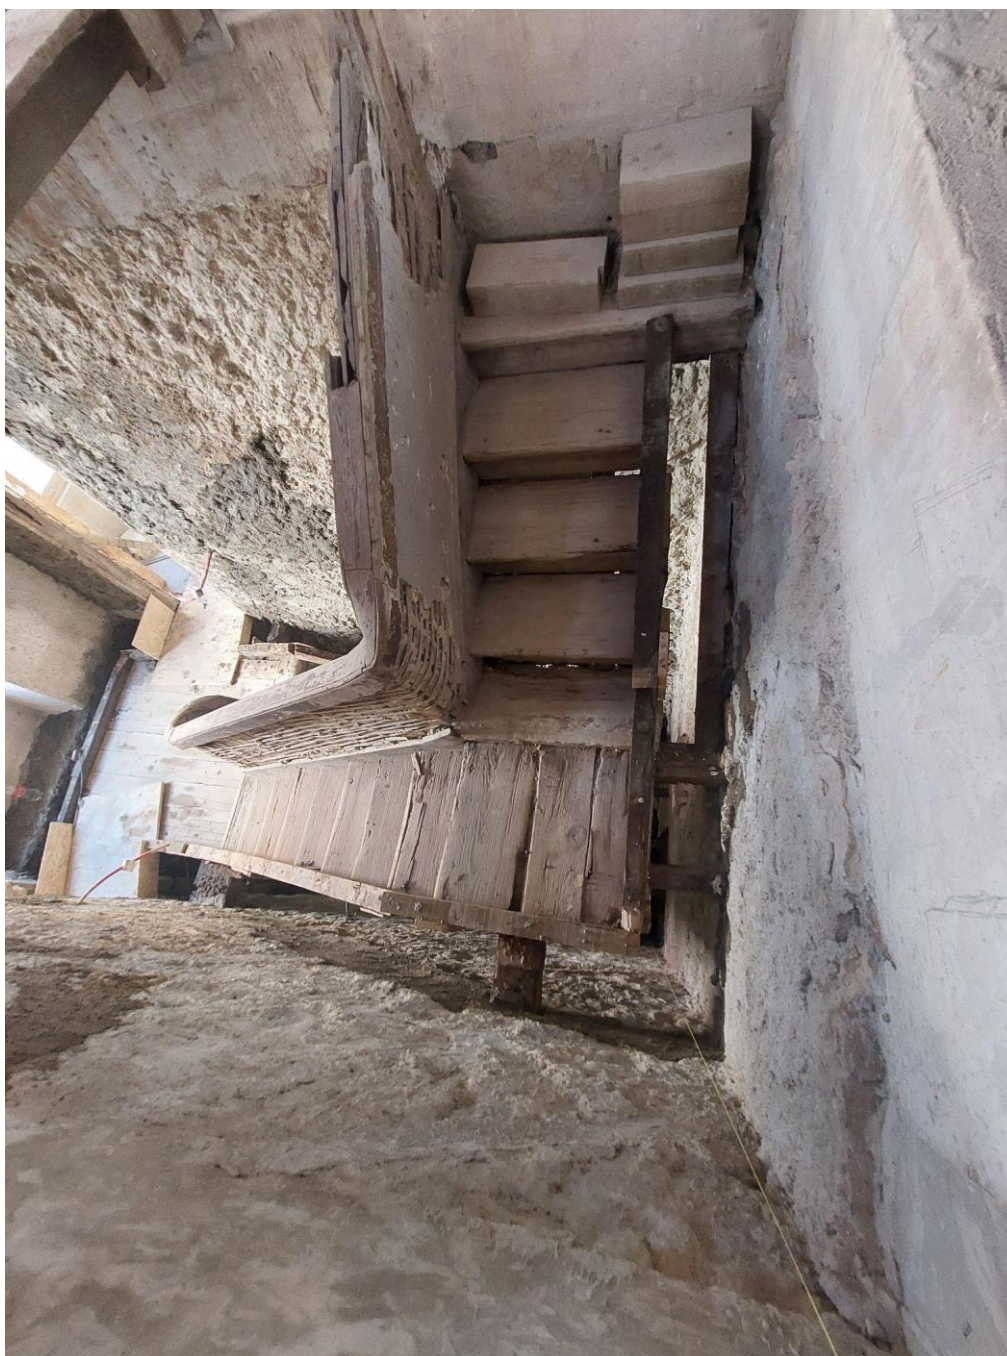

7月，施工隊開始拆除現有木樓梯。同時，他們拆除了現有牆壁上的舊灰泥，並應用了加固灰泥。隨後，他們開始平整牆壁。
