

Project: Rua do Passadiço 55, Lisboa

Report Number: Passadiço - 29

施工进度报告

月度报告 2024 年 9 月至 12 月

建筑商 NS Reformas, Construcccion Y Trading S.L.Uz

当前进程

工程概述

1. 完成铺设地面铺装
2. 安装卫浴设备和照明设备
3. 组装淋浴玻璃屏风
4. 组装橱柜并放置电器
5. 组装木工衣柜、衣柜
6. 最后的壁画
7. 安装门
8. 公共区域的磁砖
9. 楼梯组装完成
10. 安装阳台护栏
11. 做好强制检查工作




工程照片







按照工作安排，施工队开始进行地板安装。他们成功地完成了整个地板的隔音应用，确保了声学性能的提升。之后，他们开始铺设木地板，仔细对齐每块地板，以创造出无缝且美观的饰面。

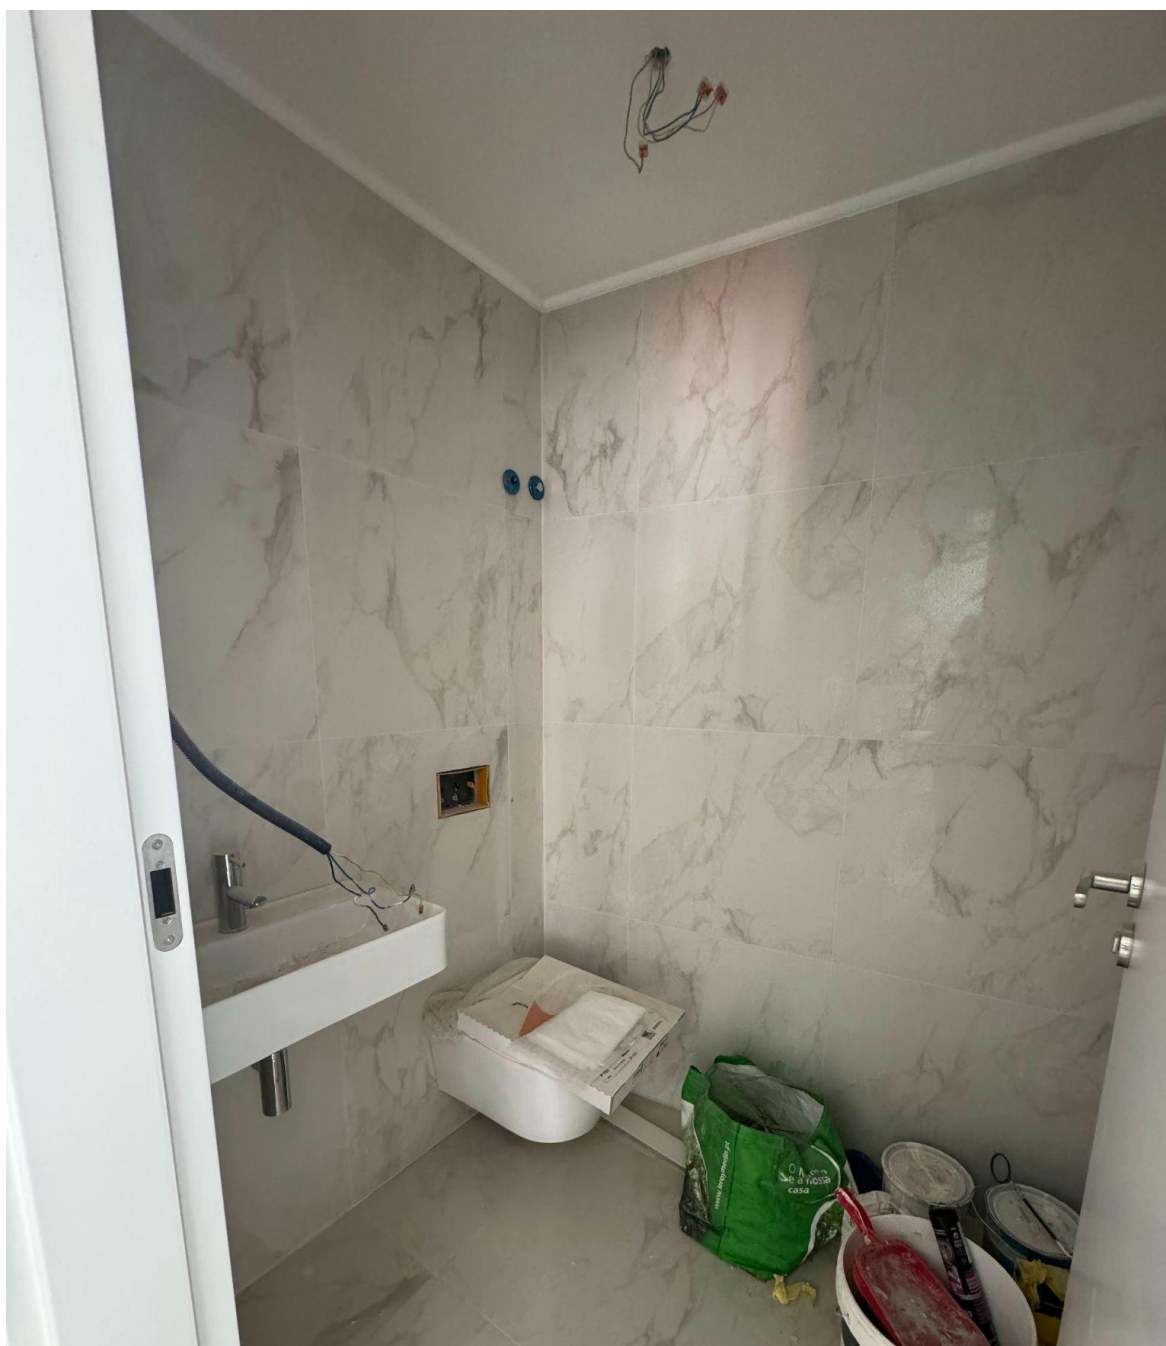


Project: Rua do Passadiço 55, Lisboa

Report Number: Passadiço - 29



YAO TENG FGI
Property Development

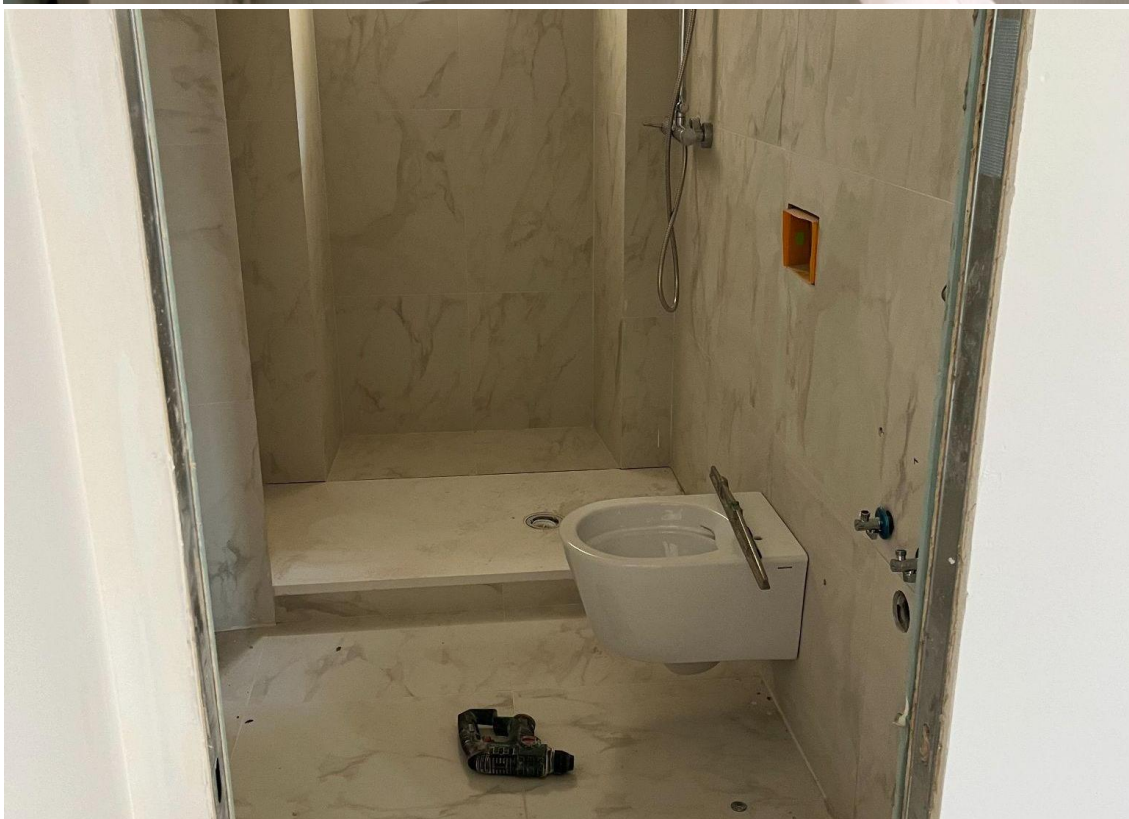


Project: Rua do Passadiço 55, Lisboa

Report Number: Passadiço - 29



YAO TENG FGI
Property Development



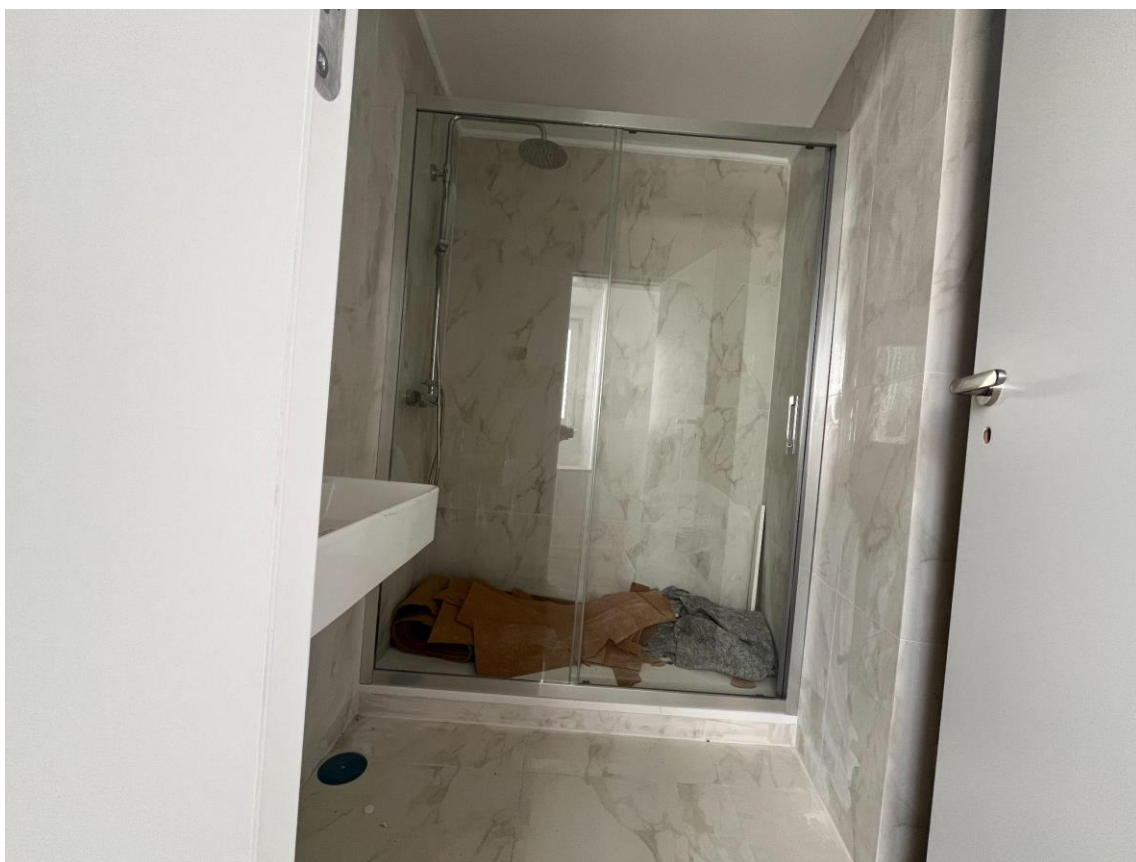

在 8 月取得进展的基础上，施工团队在 9 月和 10 月继续在公寓浴室安装卫浴设备。这包括安装淋浴盘和玻璃门、洗脸盆和水龙头。团队确保所有固定装置正确对齐并牢固安装，遵守功能和设计标准，打造现代、高质量的浴室空间。
















厨房木工在工场生产，9月运抵现场。从9月开始，施工队开始精心组装橱柜，柜体颜色为淡雅的墨绿色，并于10月初完成安装。厨房用具于10月抵达后，团队开始安装设备和固定装置，确保它们与新安装的橱柜和台面无缝集成，形成一个功能齐全且美观的厨房。

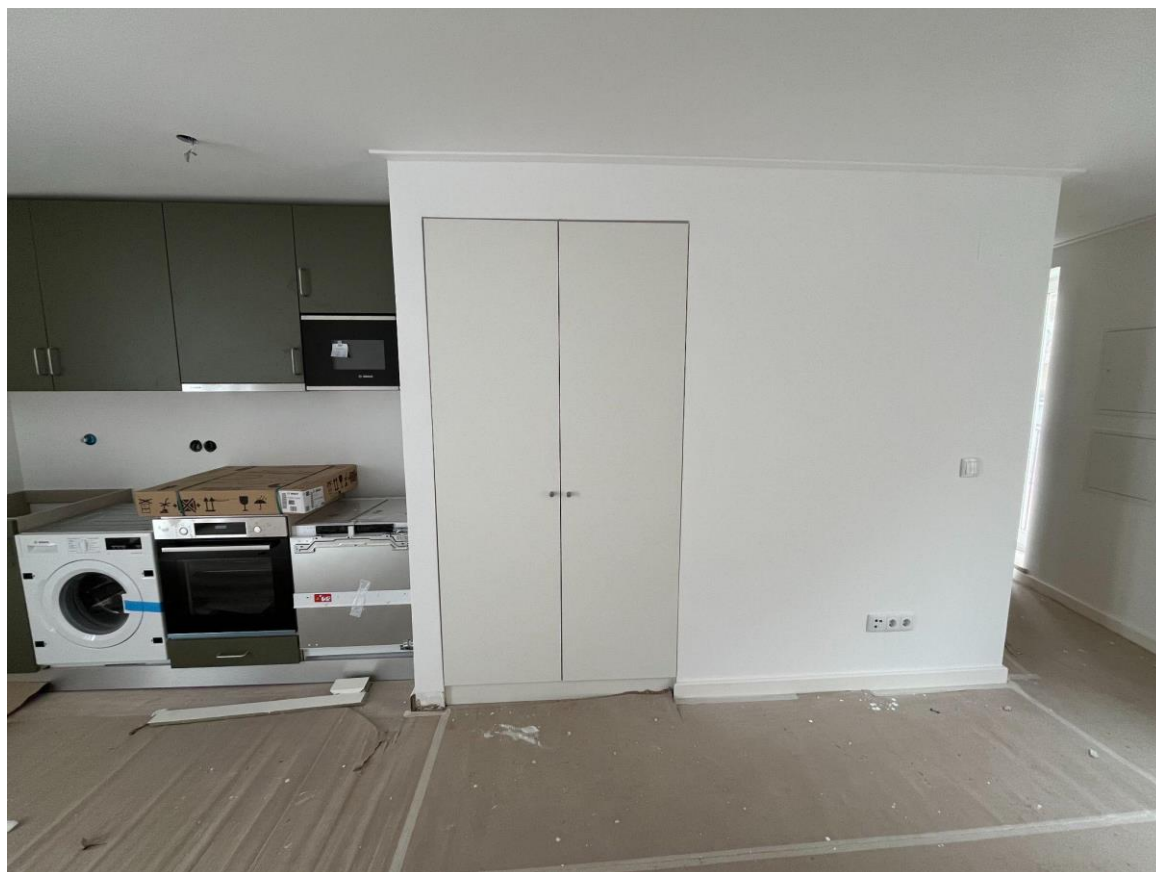

Project: Rua do Passadiço 55, Lisboa

Report Number: Passadiço - 29



YAO TENG FGI
Property Development





除了厨房橱柜的木工工作外，还生产定制化的橱柜和衣柜并运送到现场。施工团队将这些单元安装在公寓中，确保它们按照建筑规划放置，为日常使用提供充足的储存空间和功能，同时保持设计美感。





Project: Rua do Passadiço 55, Lisboa

Report Number: Passadiço - 29



YAO TENG FGI
Property Development







同时，施工队收到门材后，开始组装室内门以及公寓入口安全门。这些门经过精心安装，以确保安全性和美观性与建筑物的整体设计保持一致。










The installation of the staircase was completed, both in the apartments for interior use and in the common areas. Following this, the builders began tiling the common area floors with ceramic tiles, carefully applying a classic pattern to enhance the aesthetic appeal and durability of the spaces.

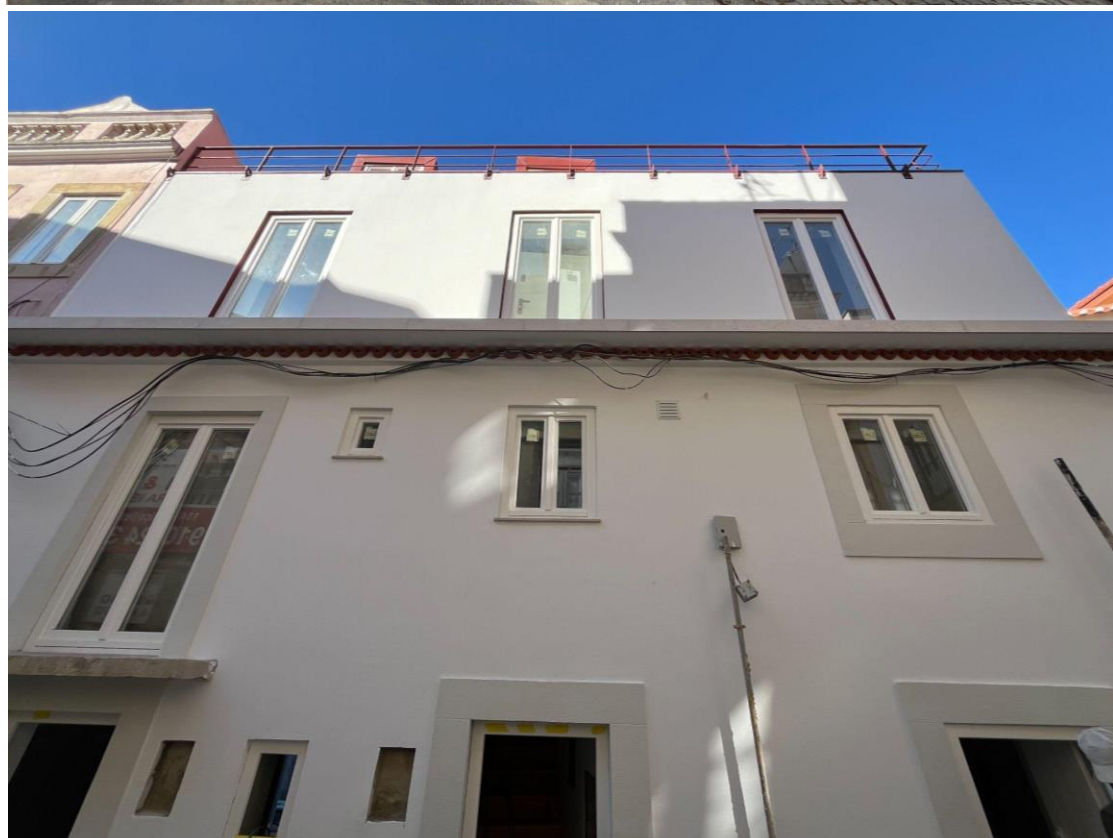











阳台护栏已于 9 月生产完毕并交付现场。然后，建筑商将它们安装在每个公寓的阳台上，确保安全和美观。这些护栏不仅提供必要的保护，还增强了阳台的整体设计。

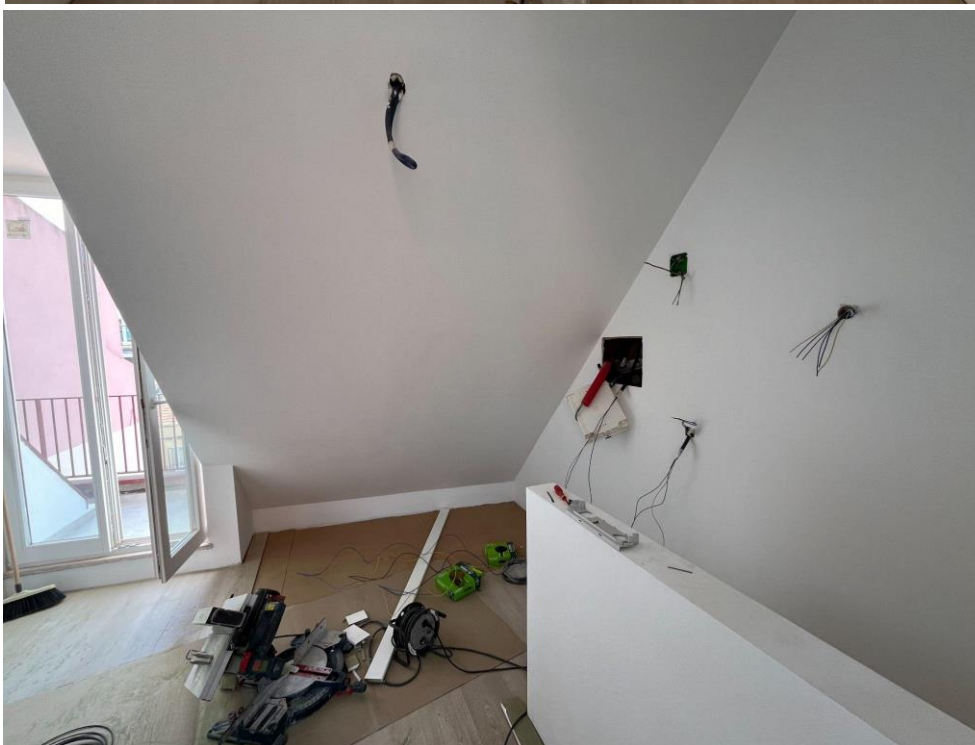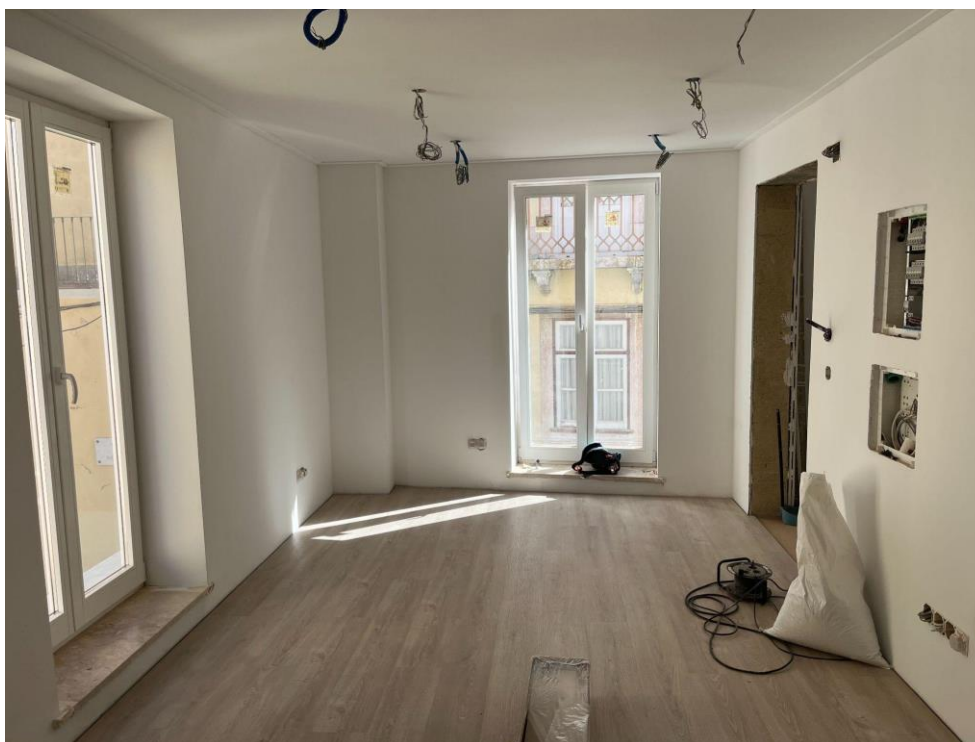



所有内墙的最后涂装已于十月完成。 11 月，技术人员开始在整个饭店安装照明灯具。

此外，我们的耀腾未来房产开发有限公司项目经理开始准备向市政厅申请使用许可证所需的强制专家检查。这包括准备电网执行计划、供水系统执行计划、能源效率评估、声学测试以及其他必要的合规文件。
