

项目: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

报告序号: Laurel - 08



工程汇报

月度报告

开始时间: 2022 年 10 月 1 日, 星期六 结束时间: 2022 年 10 月 31 日, 星期一

承建方

LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto

当前进程

工作概述

1. 完成建筑封顶梁
2. 建造混凝土结构
3. 从现有墙壁上去除旧石膏
4. 挖掘工作
5. 建造外墙

项目: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

报告序号: Laurel - 08

工程照片





项目: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

报告序号: Laurel - 08



项目: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

报告序号: Laurel - 08






10 月，施工人员完成了钢筋结构和木制模具的组装，并浇筑混凝土形成顶梁，将所有打桩平铺在一起，为下一步打下基础。我们继续在梁上安装柱子和砖块，从二楼到三楼建造混凝土结构。

项目: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

报告序号: Laurel - 08

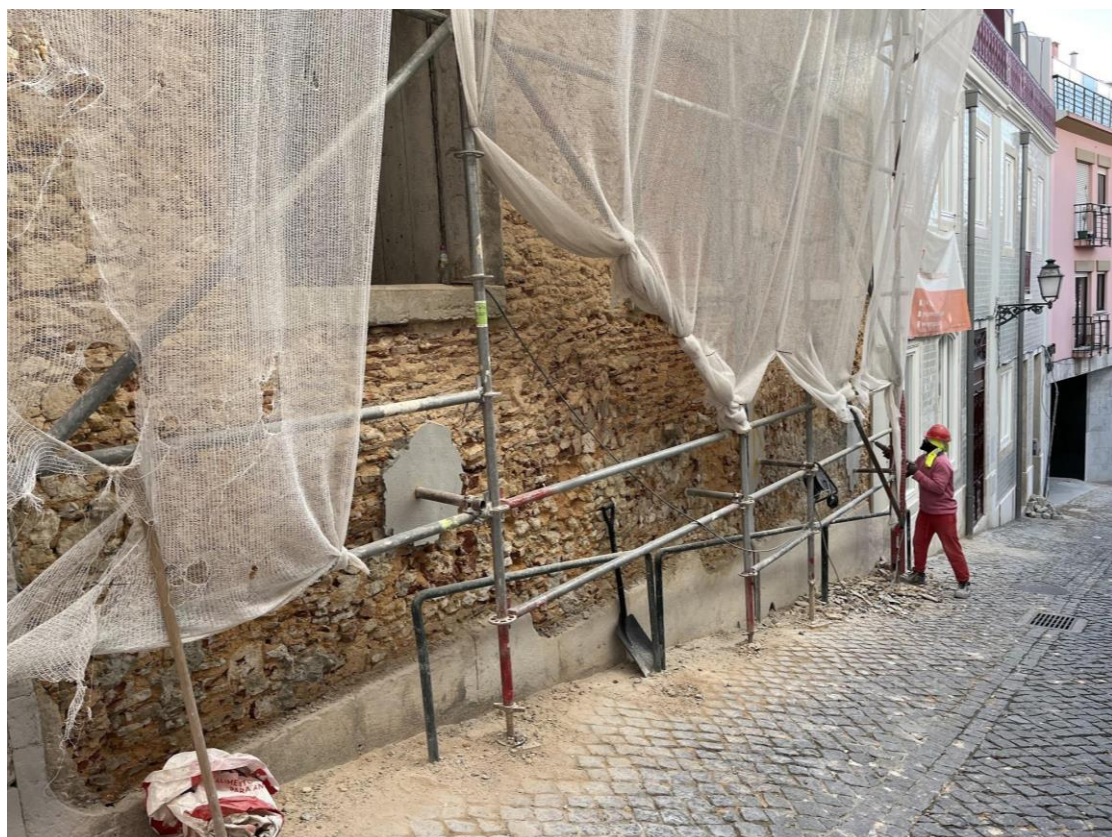

与此同时，施工人员开始将那些旧有的石膏从立面墙上拆除，然后填补空隙，稍后再次在上面涂抹加固石膏。





按照工作计划，施工人员正在挖掘建筑基础的地基，以建造钢结构在未来加固整个建筑结构。



2 楼外墙于 10 月完工。同时，施工人员用砖块扩展了与下一栋建筑相连的现有墙壁。
