

項目: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

報告序號: Laurel - 08



工程彙報

月度報告

開始時間: 2022 年 10 月 1 日, 星期六 結束時間: 2022 年 10 月 31 日, 星期一

承建方

LADRILLO S.A - Construção, Remediações e Projecto

當前進程

工作概述

1. 完成建築封頂梁
2. 建造混凝土結構
3. 從現有牆壁上去除舊石膏
4. 挖掘工作
5. 建造外牆

工程照片






項目: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

報告序號: Laurel - 08







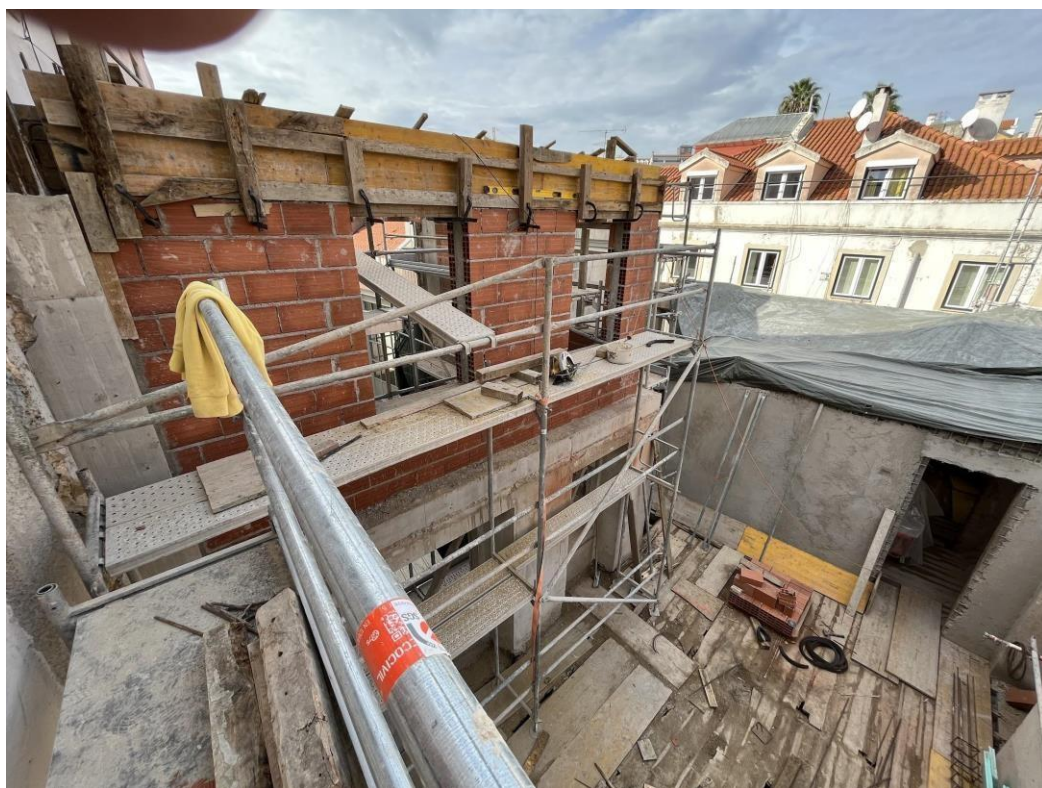

10 月，施工人員完成了鋼筋結構和木制模具的組裝，並澆築混凝土形成頂梁，將所有打樁平鋪在一起，為下一步打下基礎。我們繼續在梁上安裝柱子和磚塊，從二樓到三樓建造混凝土結構。

項目: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

報告序號: Laurel - 08

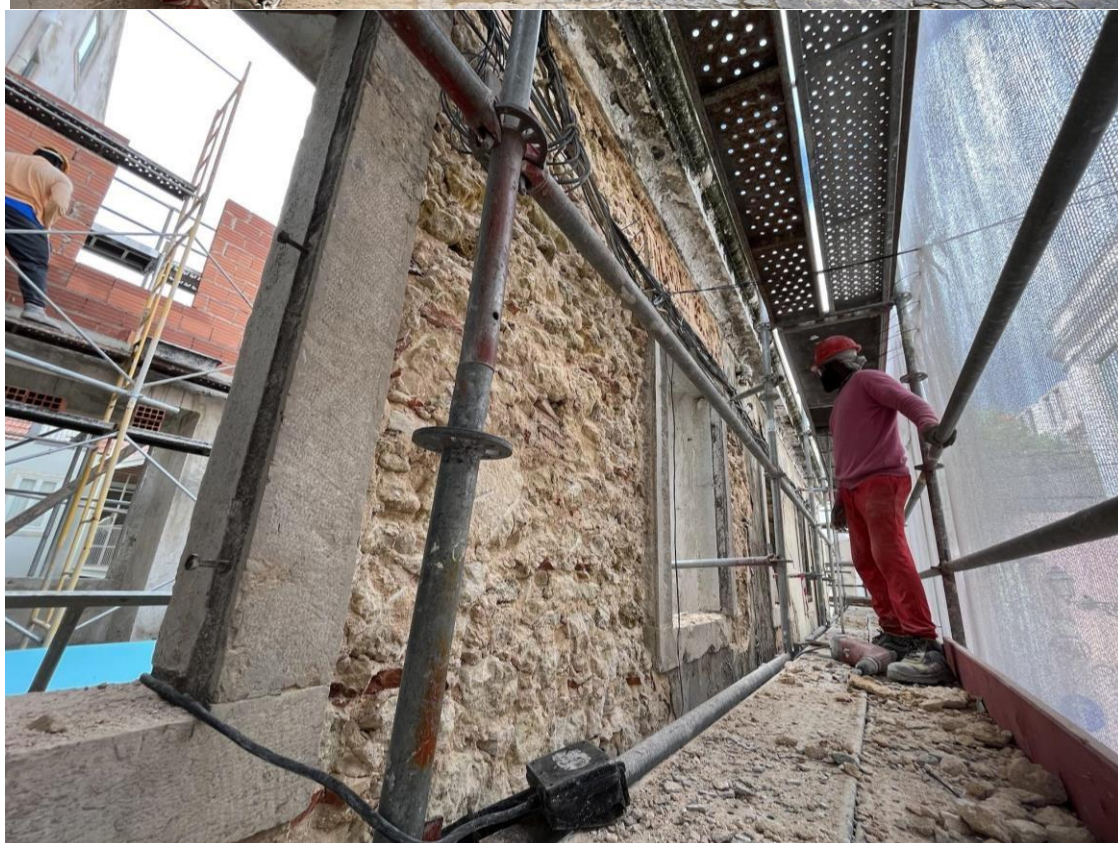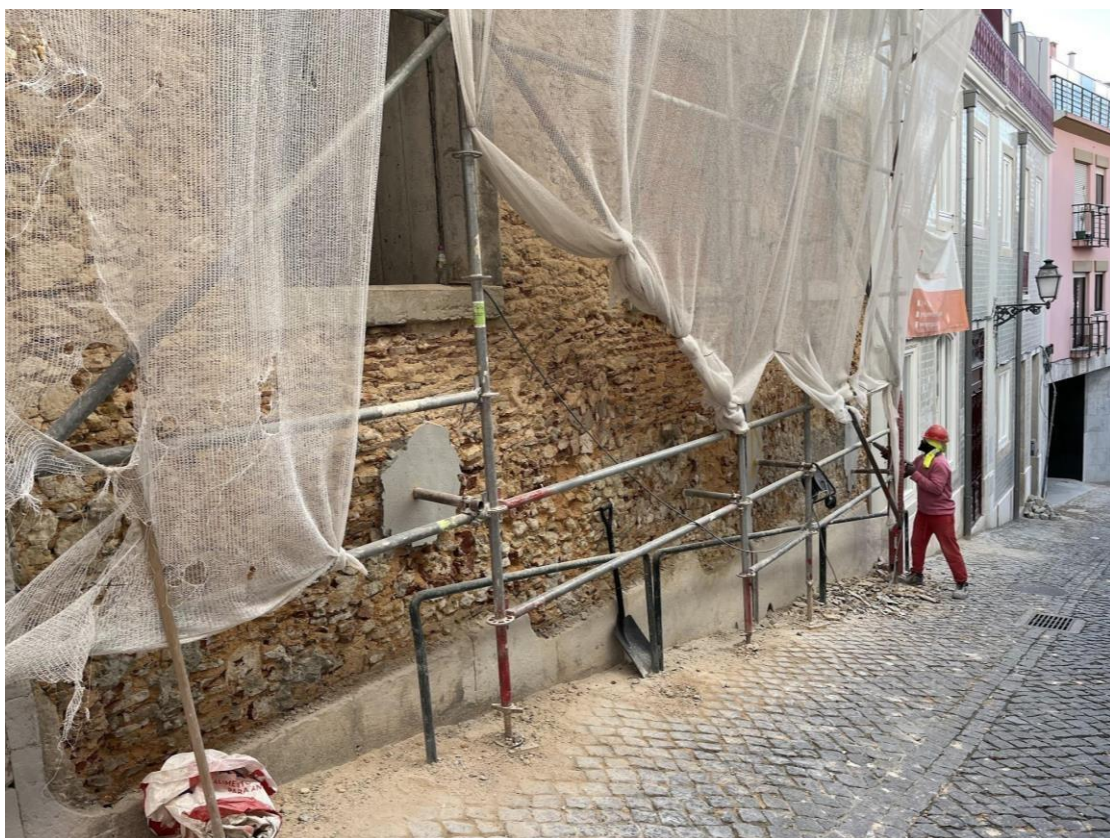

與此同時，施工人員開始將那些舊有的石膏從立面牆上拆除，然後填補空隙，稍後再次在上面塗抹加固石膏。





按照工作
計畫，施工人員正在挖掘建築基礎的地基，以建造鋼結構在未來加固整個建築結構。



2樓外牆於 10月完工。同時，施工人員用磚塊擴展了與下一棟建築相連的現有牆壁。
