

項目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

報告序號: Passadiço - 07



## 工程彙報

月度報告

開始時間: 2022 年 10 月 1 日, 星期六 結束時間: 2022 年 10 月 31 日, 星期

—

承建方

NS Reformas, Construcción Y Trading S.L.U

## 當前進程

工作概述


1. 在一樓鋪設混凝土結構
2. 完成地基施工
3. 完成內牆加固
4. 開始拆除一樓

項目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

報告序號: Passadiço - 07

## 工程照片



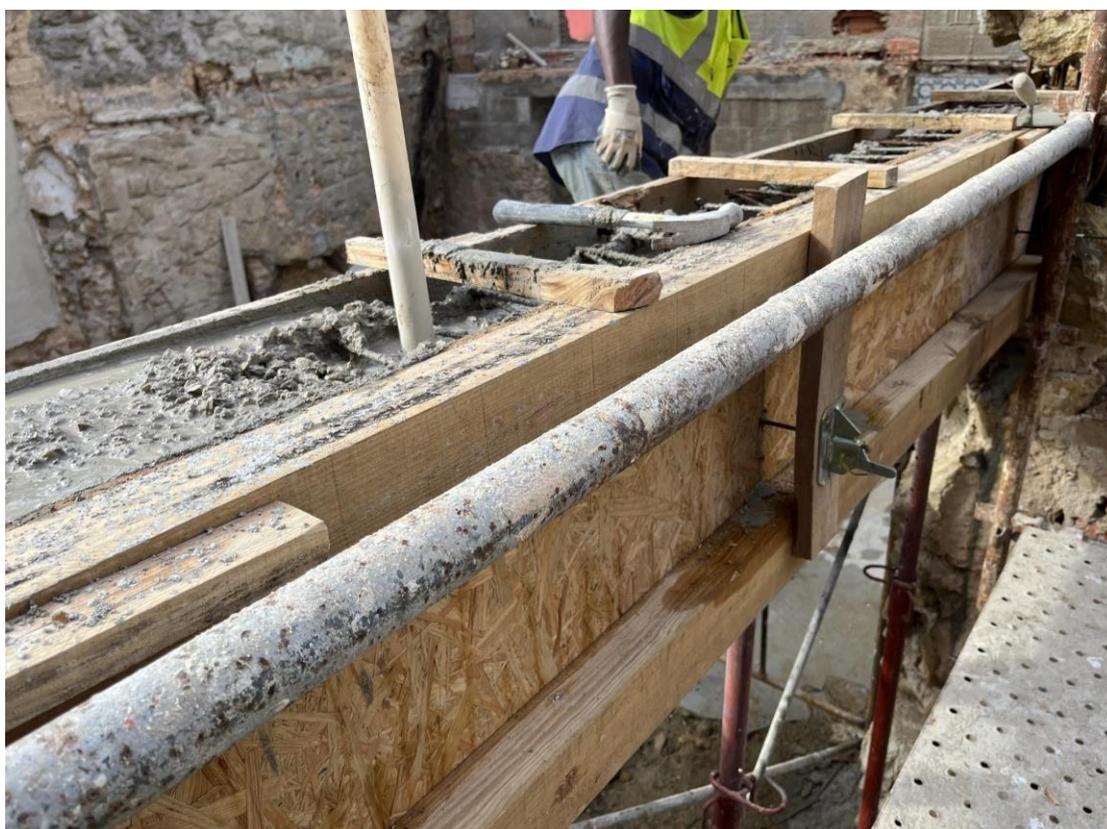

項目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

報告序號: Passadiço - 07





正如之前的報導中提到的，施工人員挖掘了地基，以加固新的結構基礎。9 月份，一層薄薄的混凝土被鋪設到用作地基的地下室，之後開始逐步安裝鋼筋和製作木質模具，然後施工人員將混凝土倒入模具中，在 10 月份建造完成了地基腳。

此外，施工人員繼續在封頂梁上工作。我們將混凝土澆注到模具中以建造外牆的封頂梁，以加強外牆結構並避免未來倒塌。10 月下旬，我們開始在封頂梁上方組裝柱子，對一樓進行結構加固。

項目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

報告序號: Passadiço - 07



項目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

報告序號: Passadiço - 07



項目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

報告序號: Passadiço - 07





施工人員拆除了原有立面牆體的舊石膏，然後填充牆體裂縫的空隙，並在牆壁上鋪設網格，鋪設鋼筋石膏作為牆體的保護。10月，我們完成了內牆的結構加固。

之後，我們開始拆除底層，並根據建築計畫進行更深的挖掘。
