

项目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

报告序号: Passadiço - 14

工程汇报

月度报告

开始时间: 2023 年 5 月 1 日星期一 结束时间: 2023 年 5 月 31 日星期三

承建方

NS Reformas, Construccion Y Trading S.L.U

当前进程

工程概述

1. 完成 3 层楼板并开始安装屋顶结构
2. 完成二层砌体墙安装
3. 安装墙体石膏板
4. 在底层安装电力和污水基础设施

Process Photos





项目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

报告序号: Passadiço - 14



项目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

报告序号: Passadiço - 14

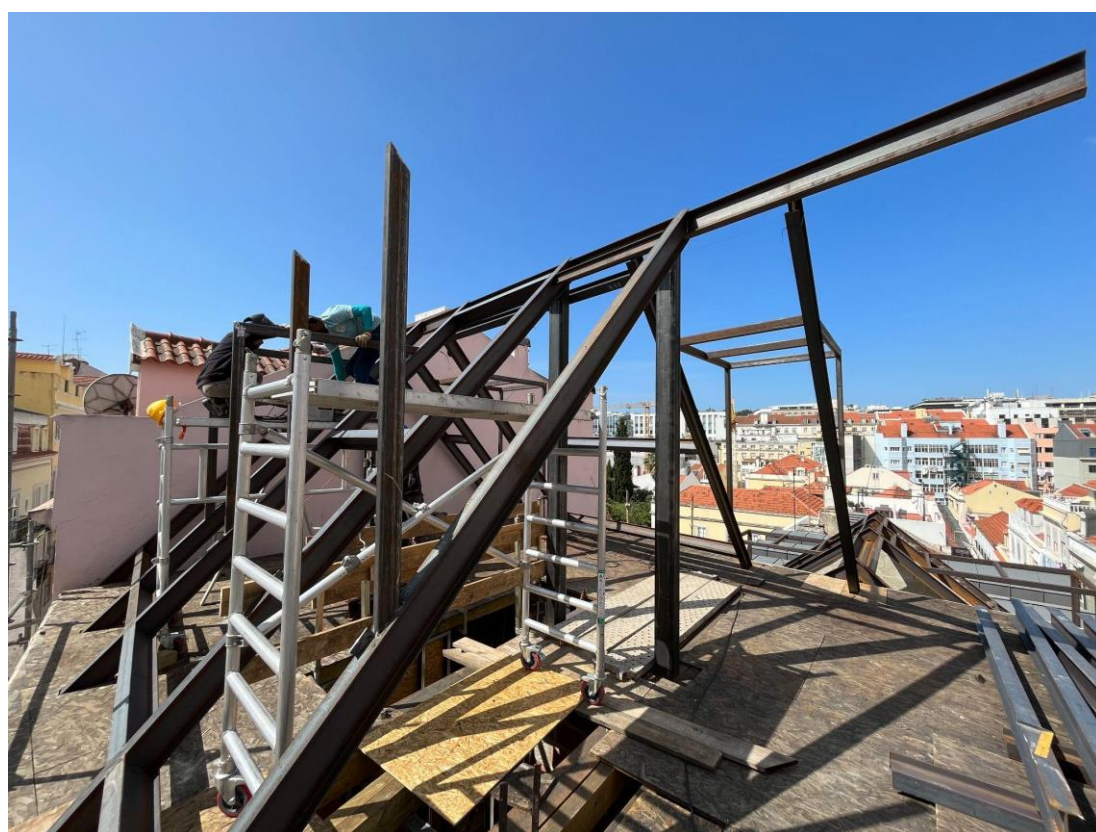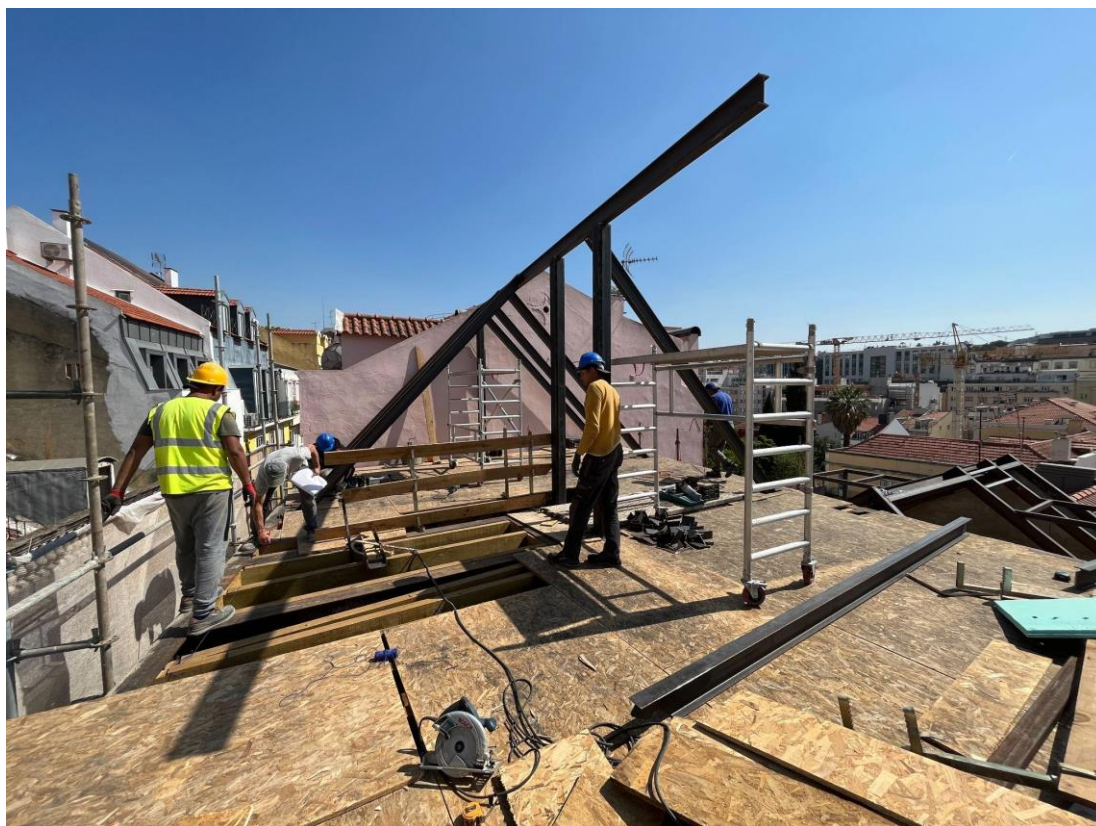

项目: Rua do Passadiço 55, Lisboa


报告序号: Passadiço - 14

正如上次报告中提到的，建筑商正在组装 3 楼的钢结构，并放置木梁。之后，我们完成了 3 楼楼板的镶板。同时，我们完成了二层屋面钢结构的组装，并开始了三层屋面结构的安装工作。



项目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

报告序号: Passadiço - 14

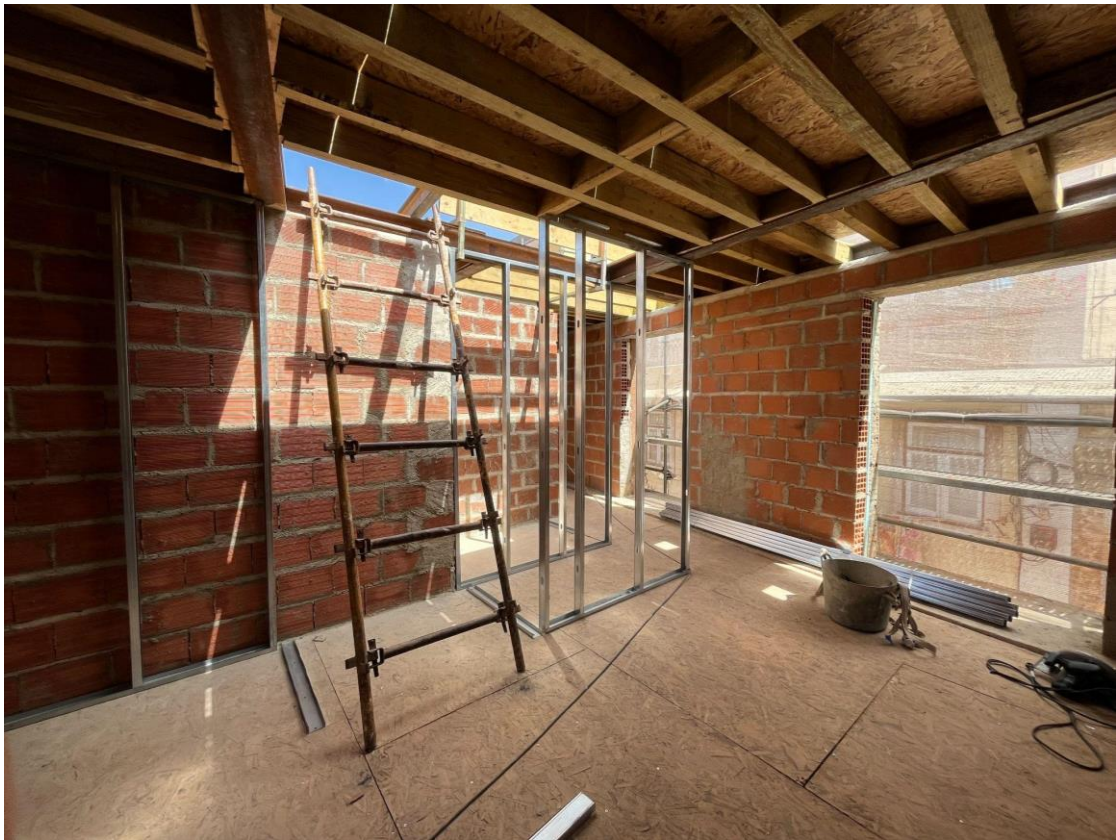

项目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

报告序号: Passadiço - 14



项目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

报告序号: Passadiço - 14

五月份，建筑内部墙壁的砌筑工作仍在仔细进行。建筑工人正在完成二楼的泥瓦匠墙施工。之后，我们开始在一楼和二楼安装墙体石膏板，以分割和定位公寓的空间和功能区。



项目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

报告序号: Passadiço - 14



项目: Rua do Passadiço 55, Lisboa

报告序号: Passadiço - 14



5月，我们的建筑商正在为一楼的基础设施安装做准备。他们为卫生间分配了污水系统箱和管道以及电线。
