

施工進度報告

月度報告

2024 年 03 月

建築商

LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto

當前進程

工程概述

1. 拆除臨時鋼結構
2. 為外牆建造圈梁
3. 加強窗戶框架


工程照片









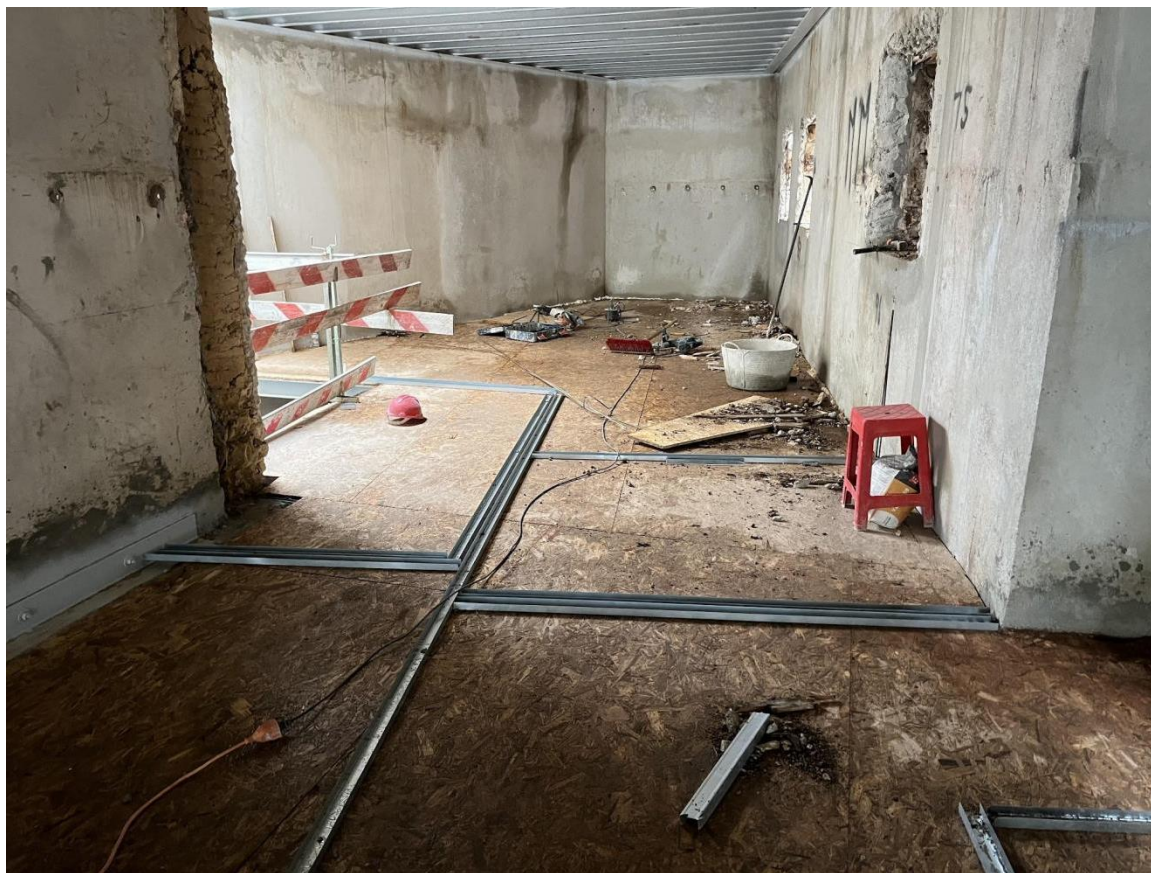

3 月，在完成 1 樓和 2 樓的鋼結構安裝和麵板鋪設後，施工團隊開始拆除臨時鋼結構，但主立面的部分除外，這些部分被保留以繼續支撐外牆。

隨後，我們開始為內牆結構放置底部鋼材，以測試隔牆佈局。這一步是為了確保符合基於實地測量的改進結構和設計計畫。











正如之前的報告所強調的，我們的 FGI 專案經理和工程師一直在積極優先考慮這座老舊建築的結構完整性和穩定性。為了預防任何潛在的牆體倒塌並保護外牆，要求在頂層建造一道圈梁來加固外牆。

此外，建築工人還加固了窗戶框架，將木制框架替換為加固鋼筋，並用混凝土填充以增加強度，並仔細重新調整窗戶的形狀。
