

施工进度报告

月度报告

2024 年 03 月

建筑商


LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto

当前进程


工程概述

1. 进行屋顶作业
2. 安装阁楼窗的钢结构

工程照片

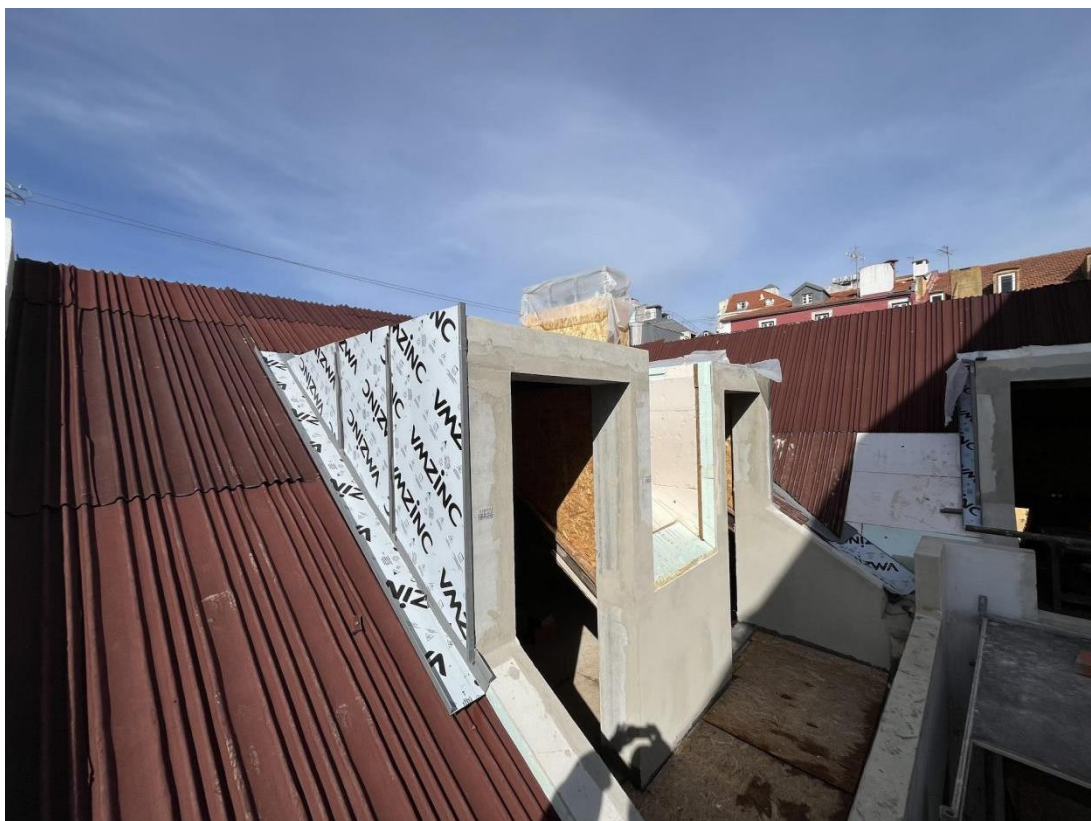



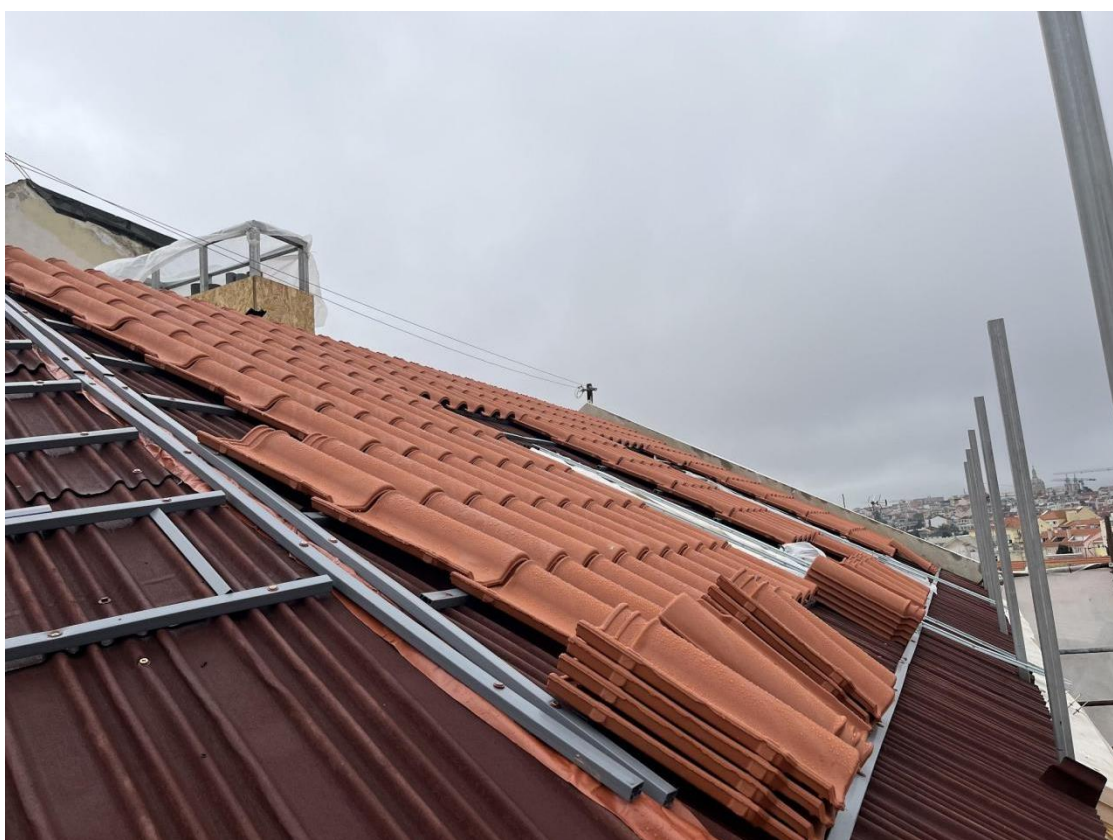





继 2 月份报告所述进展之后，建筑工人继续在上层安装隔墙。同时，开始铺设锌制屋顶和外墙板，以及屋顶瓦片。此外，我们还在屋顶上组装烟囱出口，连接来自建筑物各个部分的排气管。为了未来的维护和保护，FGI 工程师要求建筑工人安装屋顶护栏。







在上一份报告所述工作的基础上，建筑团队在 3 月份勤奋地完成了阁楼窗户的钢结构组装。随后，建筑工人们继续安装了阁楼窗户和立面的面板。此外，我们开始铺设石材窗台，以增强窗户框架的美观性和功能性。
