

## 施工進度報告

月度報告 2024 年 03 月


建築商 LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto

### 當前進程

工程概述

1. 進行屋頂作業
2. 安裝閣樓窗的鋼結構

### 工程照片

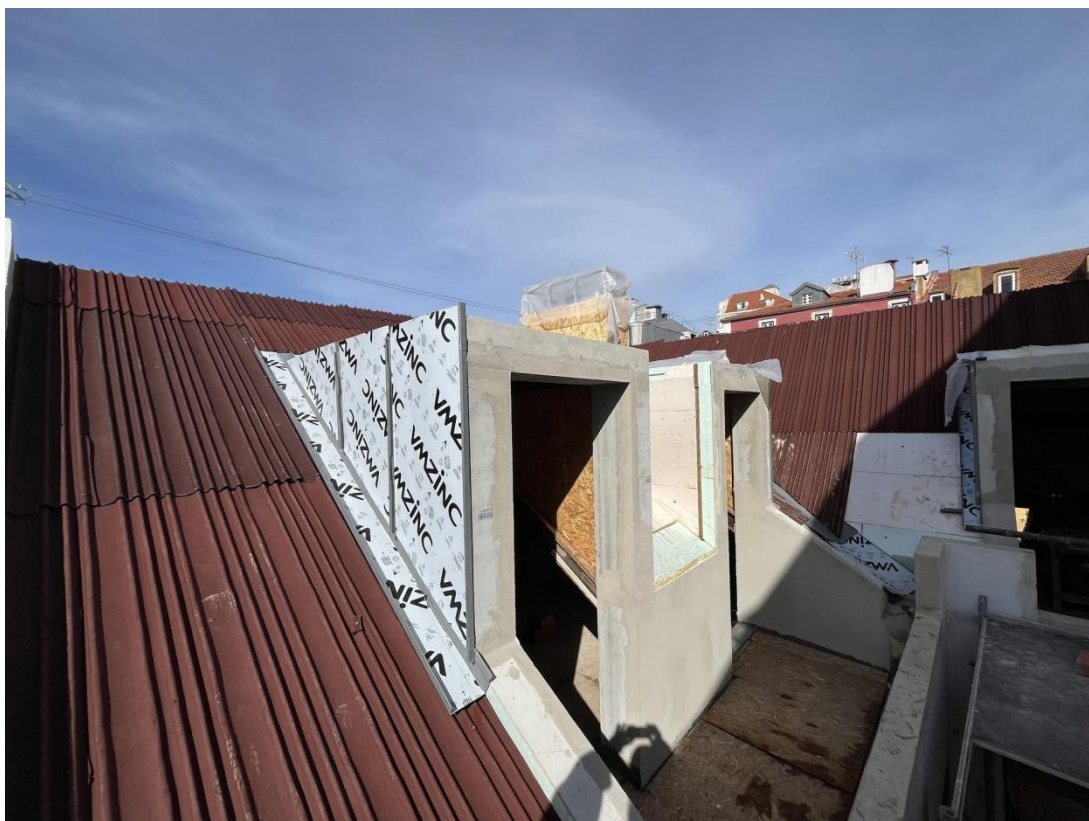









繼 2 月份報告所述進展之後，建築工人繼續在上層安裝隔牆。同時，開始鋪設鋅制屋頂和外牆板，以及屋頂瓦片。此外，我們還在屋頂上組裝煙囪出口，連接來自建築物各個部分的排氣管。為了未來的維護和保護，FGI 工程師要求建築工人安裝屋頂護欄。







在上一份報告所述工作的基礎上，建築團隊在 3 月份勤奮地完成了閣樓窗戶的鋼結構組裝。隨後，建築工人們繼續安裝了閣樓窗戶和立面的面板。此外，我們開始鋪設石材窗臺，以增強窗戶框架的美觀性和功能性。
