

## 施工进度报告

月度报告

2024 年 04 月

建筑商

LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto



## 当前进程

工程概述

1. 组装内隔墙结构
2. 开始组装屋顶钢结构
3. 完成窗框加固
4. 完成外墙抹灰

## 工程照片



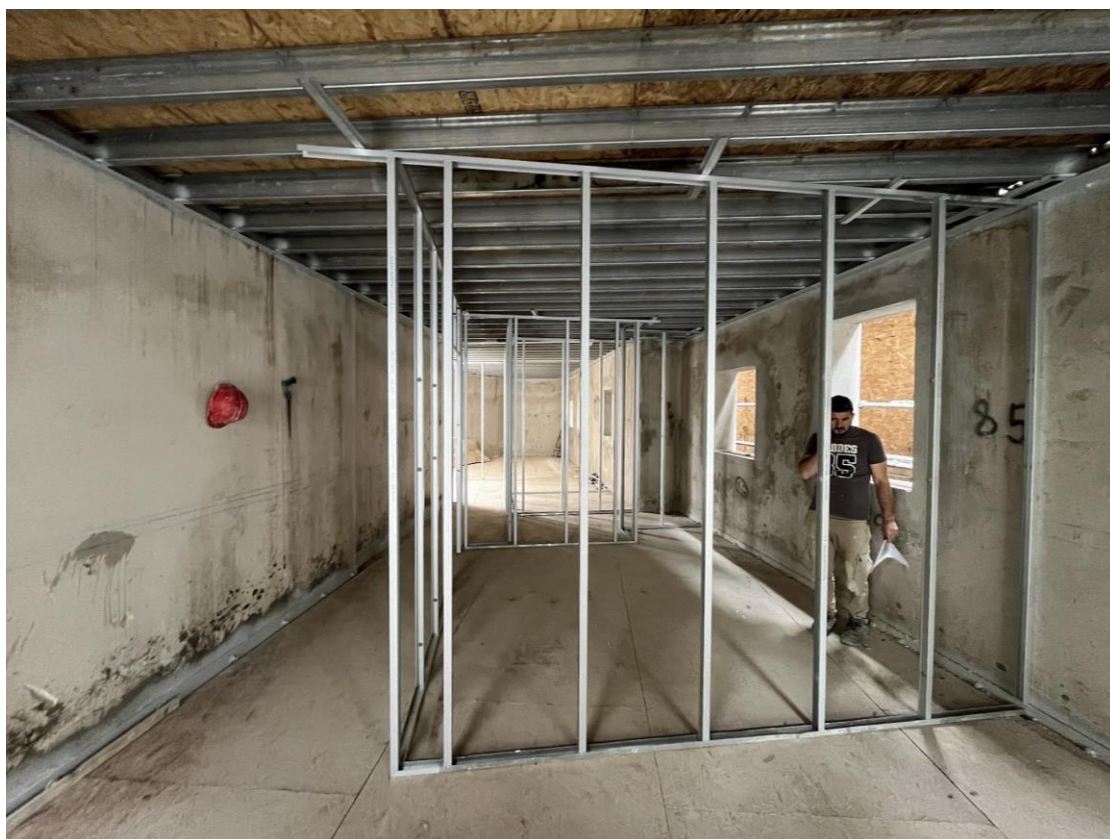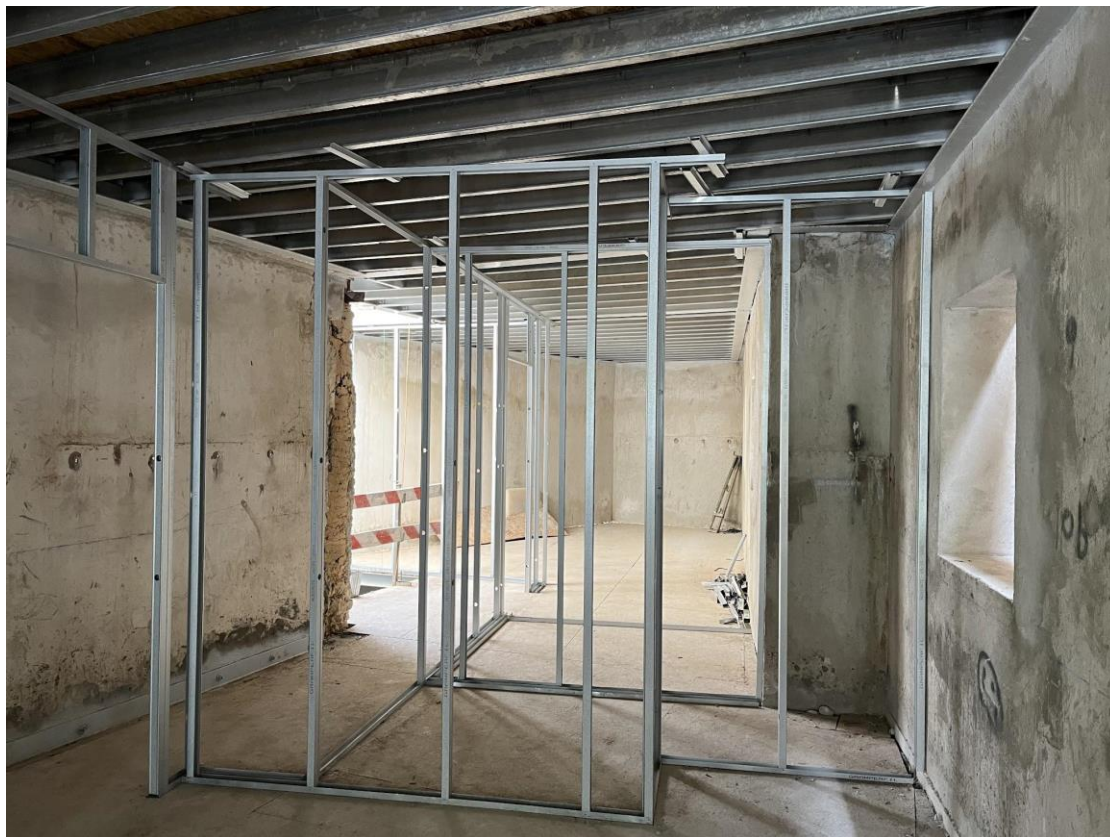



承先前的报告所述，施工队开始了建造隔间墙。整个四月，他们进一步完成了二楼和三楼室内隔间钢结构的组装工作。随后，他们在这些钢结构上安装了干墙，在施工过程中取得了重大进展。







正如先前的报告所强调的，我们的项目经理和工程师一丝不苟地致力于确保这座老化建筑的结构完整性和稳定性。在重建顶层盖梁以加固外墙后，下一步便会是顶层。  
4月，建商开始组装屋顶钢结构。









此外，施工人员继续对窗框进行加固和修复，用钢筋替换损坏的木框，用混凝土填充以增加强度，并仔细重新调整窗户形状以确保均匀性和稳定性。除了这项细致的工作外，他们还完成了建筑外墙的抹灰工作，随后对外墙进行了平整，为接着的装饰做充分的准备。
