

施工進度報告

月度報告

2024 年 04 月

建築商

LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto



當前進程

工程概述

1. 組裝內隔牆結構
2. 開始組裝屋頂鋼結構
3. 完成窗框加固
4. 完成外牆抹灰

工程照片



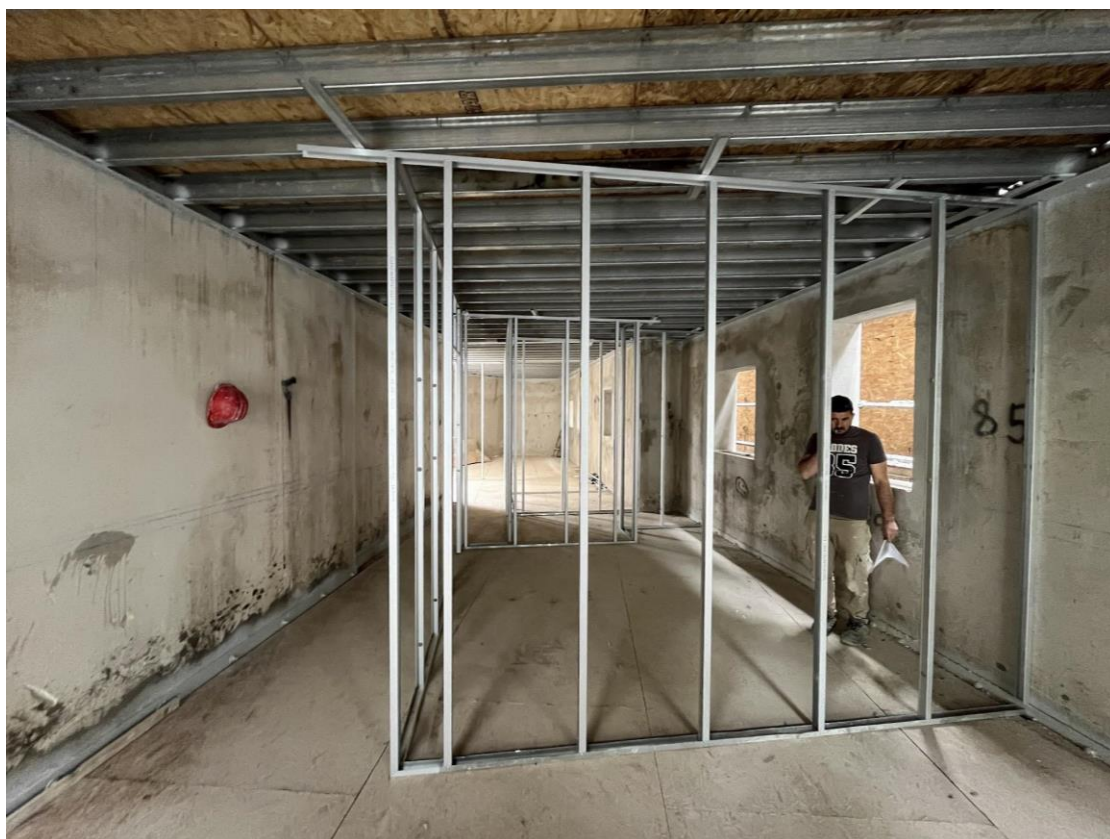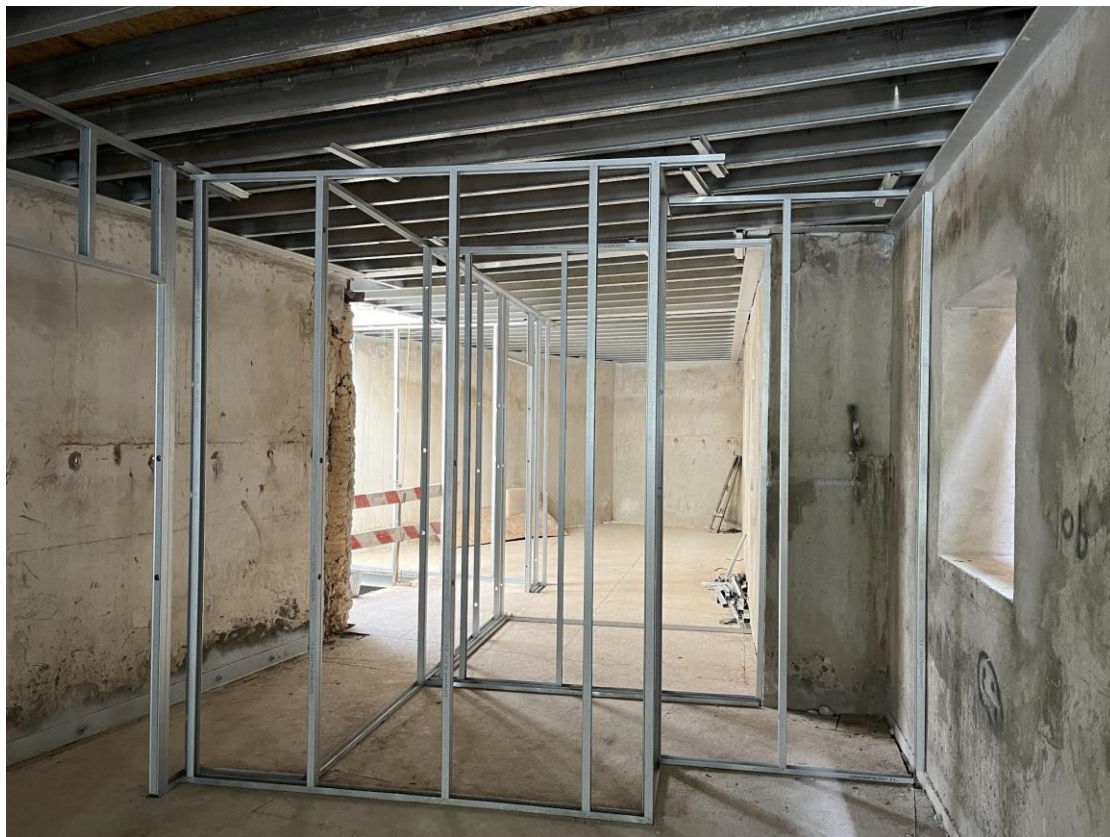



承先前的報告所述，施工隊開始了建造隔間牆。整個四月，他們進一步完成了二樓和三樓室內隔間鋼結構的組裝工作。隨後，他們在這些鋼結構上安裝了乾牆，在施工過程中取得了重大進展。







正如先前的報告所強調的，我們的專案經理和工程師一絲不苟地致力於確保這座老化建築的結構完整性和穩定性。在重建頂層蓋樑以加固外牆後，下一步便會是頂層。
4 月，建商開始組裝屋頂鋼結構。







此外，施工人員繼續對窗框進行加固和修復，用鋼筋替換損壞的木框，用混凝土填充以增加強度，並仔細重新調整窗戶形狀以確保均勻性和穩定性。除了這項細緻的工作外，他們還完成了建築外牆的抹灰工作，隨後對外牆進行了平整，為接著的裝飾做充份的準備。
