

## 施工进度报告

月度报告

2024 年 04 月

建筑商

LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto

## 当前进程

工程概述

1. 铺砌屋顶瓦片
2. 二楼立面镶板
3. 建造雨水排水系统
4. 在窗户上放置石窗台

## 工程照片









正如上一份报告中所提到的，建筑商于三月开始了锌屋顶和覆层以及屋顶瓦片的施工。四月，他们继续屋顶瓦片的施工，完成了面向花园一侧的锌覆盖和屋顶瓦片。












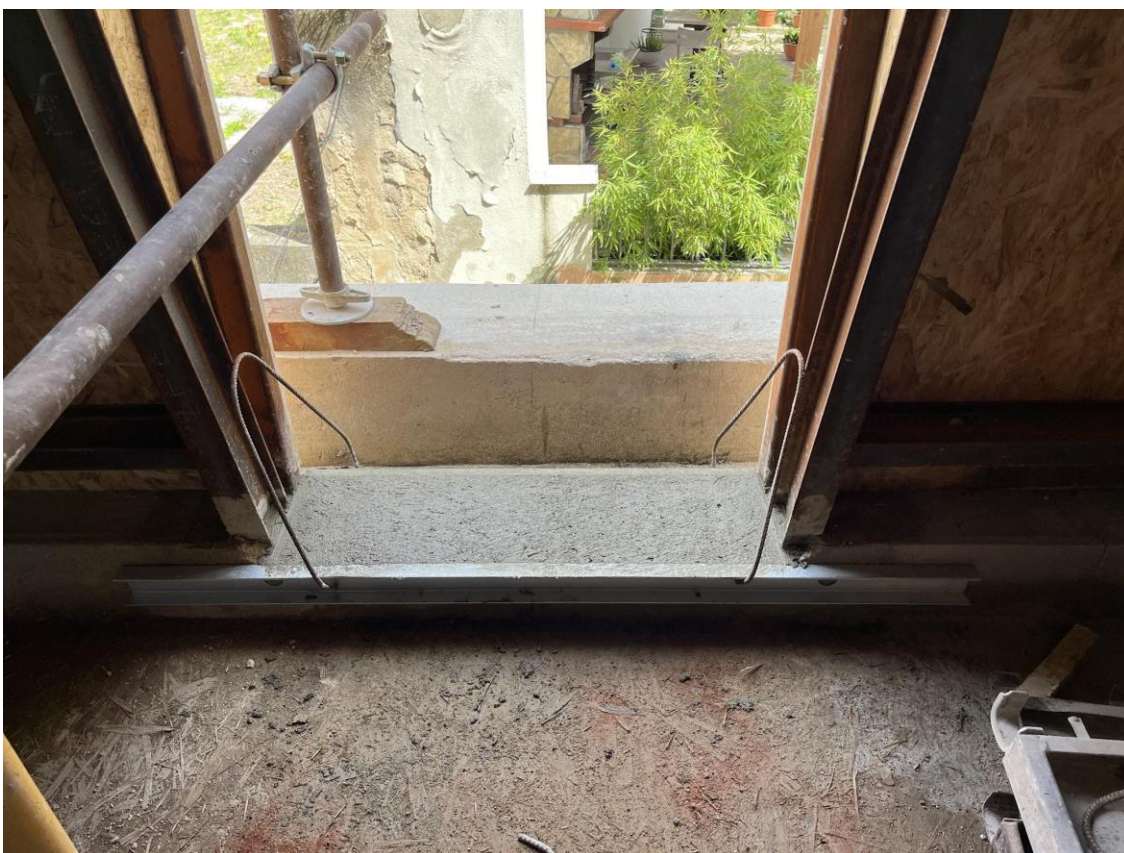



四月工程完成后，建筑商完成了二楼立面的面板安装。随后，他们开始在立面上放置隔热材料以隔热。同时，施工人员也对二楼雨水排水槽进行了施工，并进行了防水处理。

此外，在工地收到订制材料后，施工人员开始校平窗框并为窗框铺设石门坎。这不仅提高了美观性，也增强了功能性。
