

施工進度報告

月度報告

2024 年 04 月

建築商

LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto

當前進程

工程概述

1. 鋪砌屋頂瓦片
2. 二樓立面鑲板
3. 建造雨水排水系統
4. 在窗戶上放置石窗台

工程照片










正如上一份報告中所提到的，建築商於三月開始了鋅屋頂和覆層以及屋頂瓦片的施工。四月，他們繼續屋頂瓦片的施工，完成了面向花園一側的鋅覆蓋和屋頂瓦片。









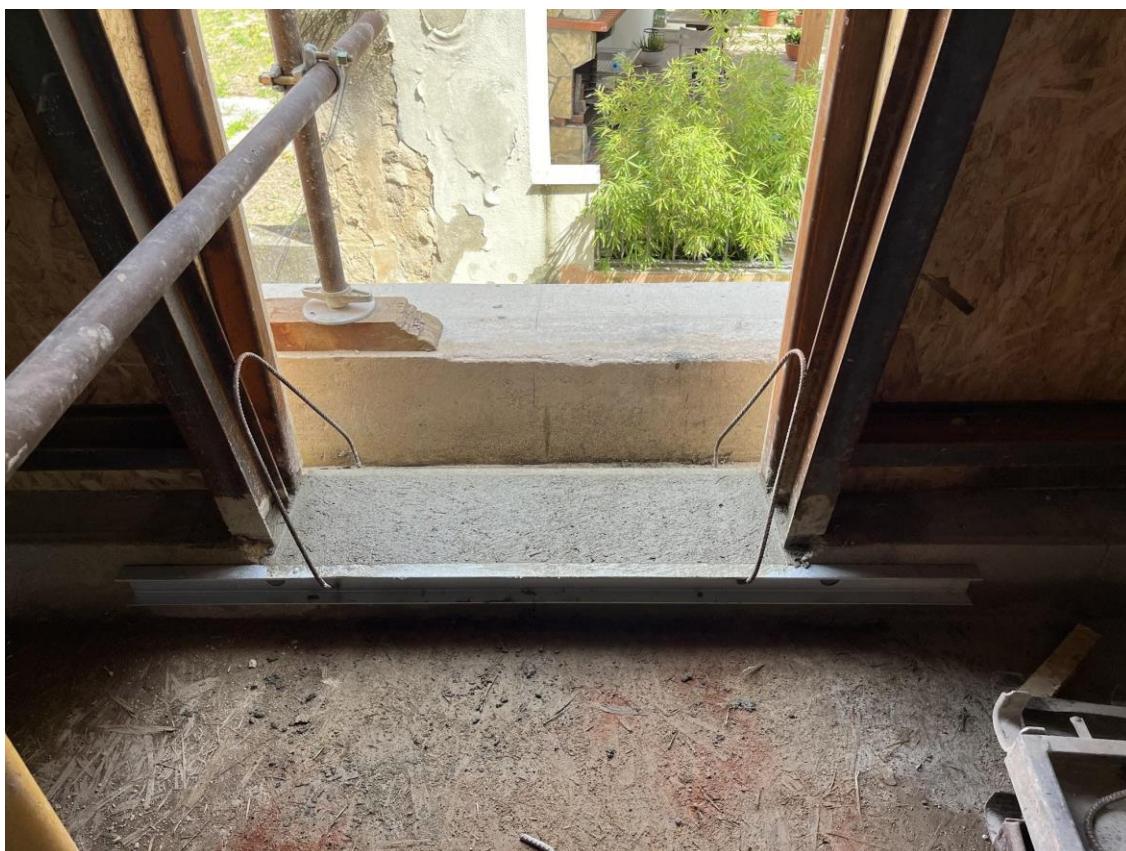



四月工程完成後，建築商完成了二樓立面的面板安裝。隨後，他們開始在立面上放置隔熱材料以隔熱。同時，施工人員也對二樓雨水排水槽進行了施工，並進行了防水處理。

此外，在工地收到訂製材料後，施工人員開始校平窗框並為窗框鋪設石門檻。這不僅提高了美觀性，也增強了功能性。
