

施工进度报告

月度报告

2024年04月

建筑商

NS Reformas, Construcción Y Trading S.L.U

当前进程


工程概述

1. 继续粉刷
2. 平整地面
3. 浴室防水

工程照片






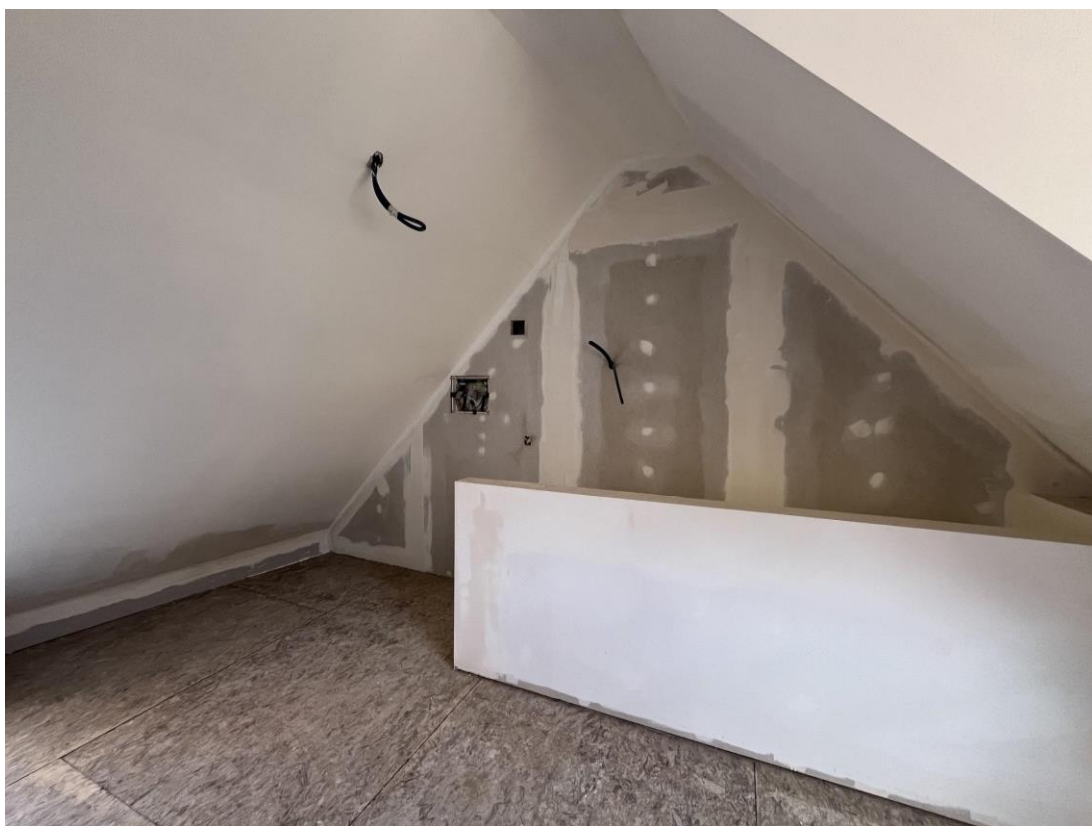




4 月，建筑工人继续积极地在—、二、三层墙壁和天花板的接缝进行处理和填充。随后，他们开始将公寓和公共楼梯的墙壁和天花板漆成白色。

此外，他们开始铺设地板，平整表面，为最终的路面安装做准备。

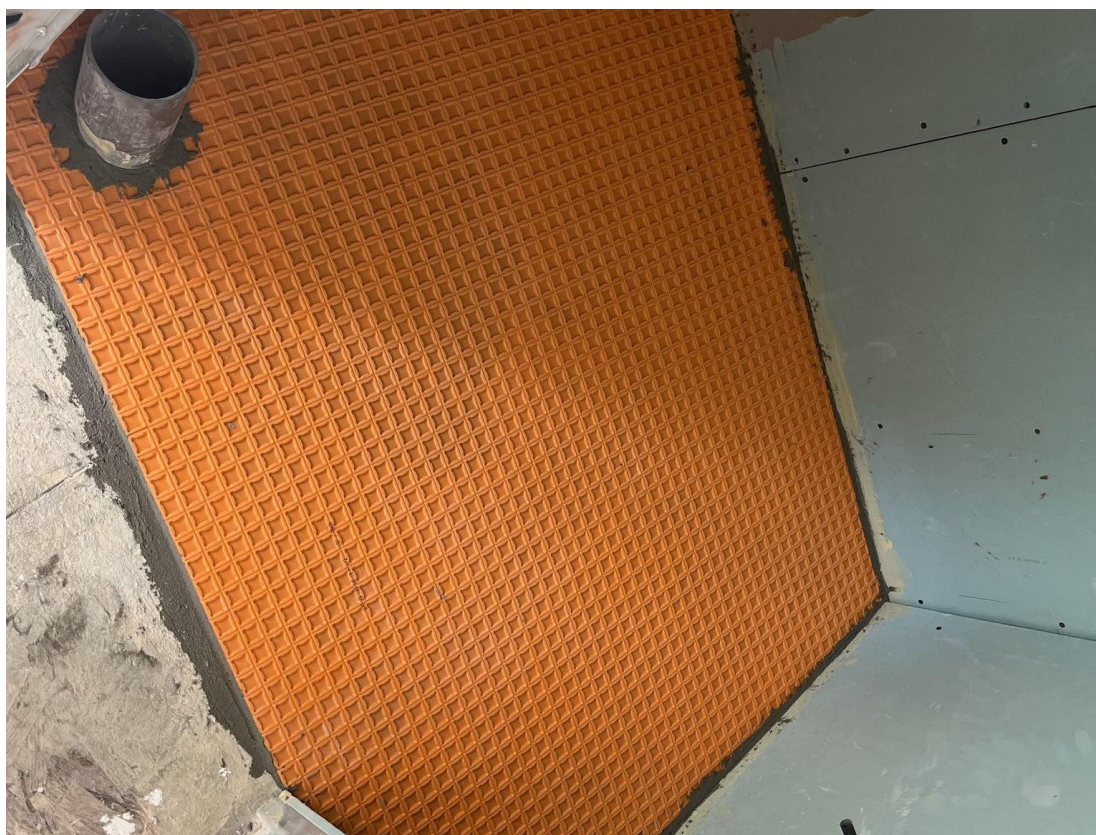

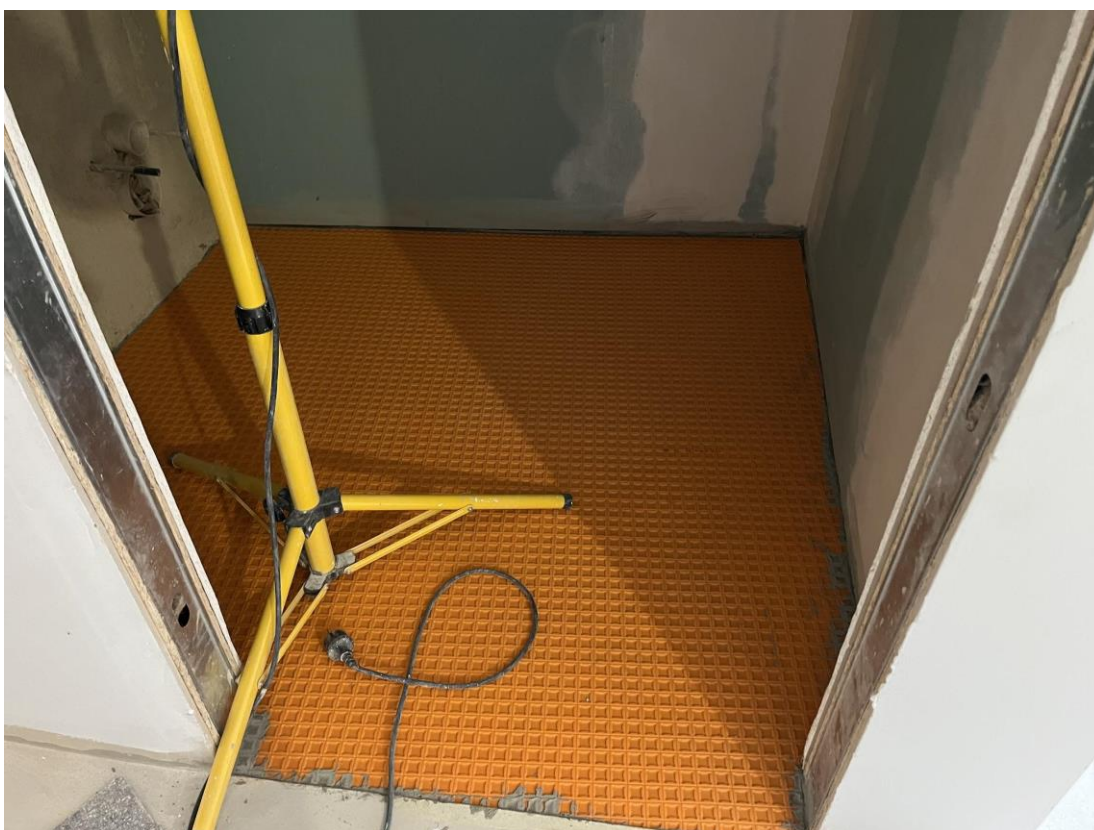

Project: Rua do Passadiço 55, Lisboa

Report Number: Passadiço - 25



同时，建筑工人开始对底层以上公寓的浴室区域进行防水处理，为接下来的铺砌瓷砖阶段做准备。
