

施工進度報告

月度報告 2024年04月

建築商 NS Reformas, Construccion Y Trading S.L.U


當前進程

- 工程概述
1. 繼續粉刷
 2. 平整地面
 3. 浴室防水

工程照片







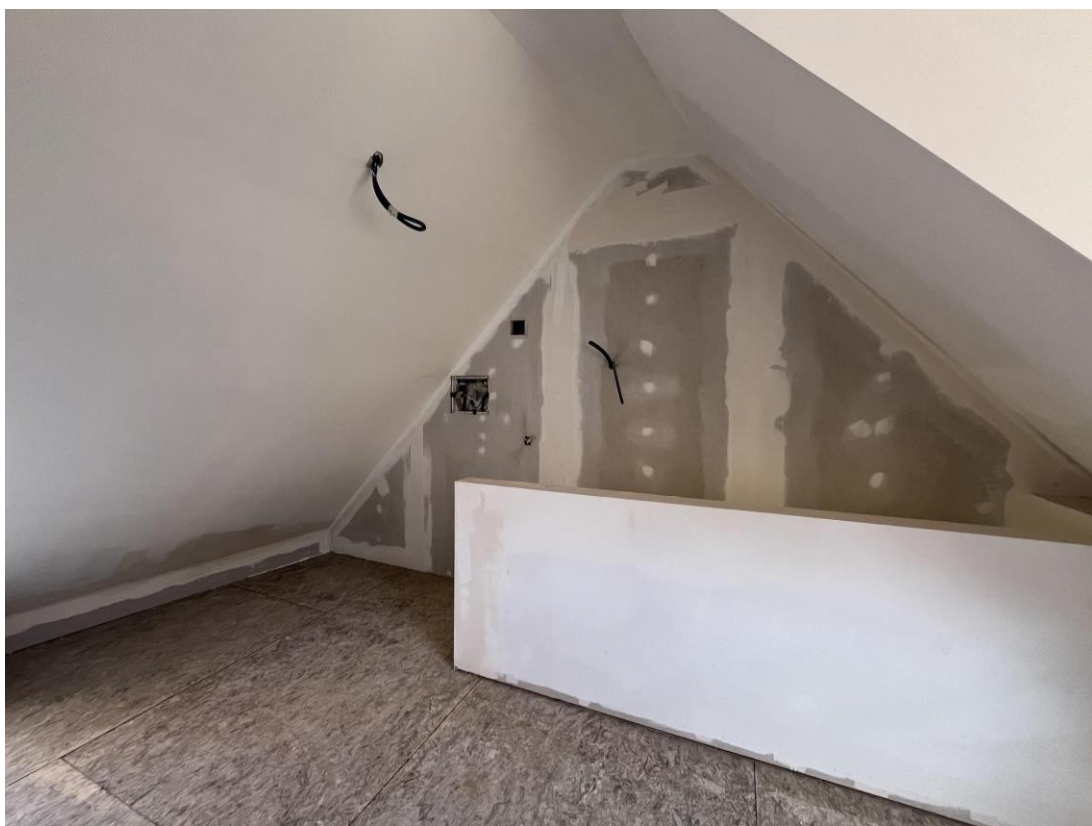



4 月，建築工人繼續積極地在一、二、三層牆壁和天花板的接縫進行處理和填充。隨後，他們開始將公寓和公共樓梯的牆壁和天花板漆成白色。此外，他們開始鋪設地板，平整表面，為最終的路面安裝做準備。

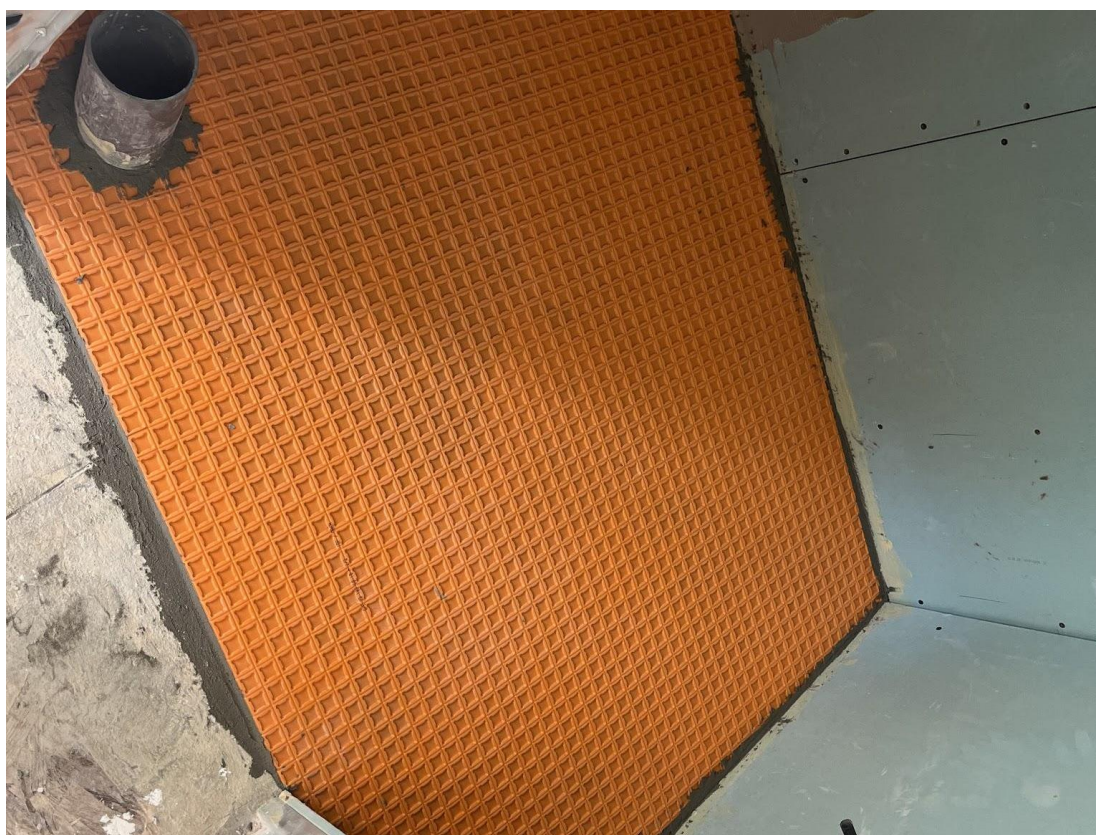

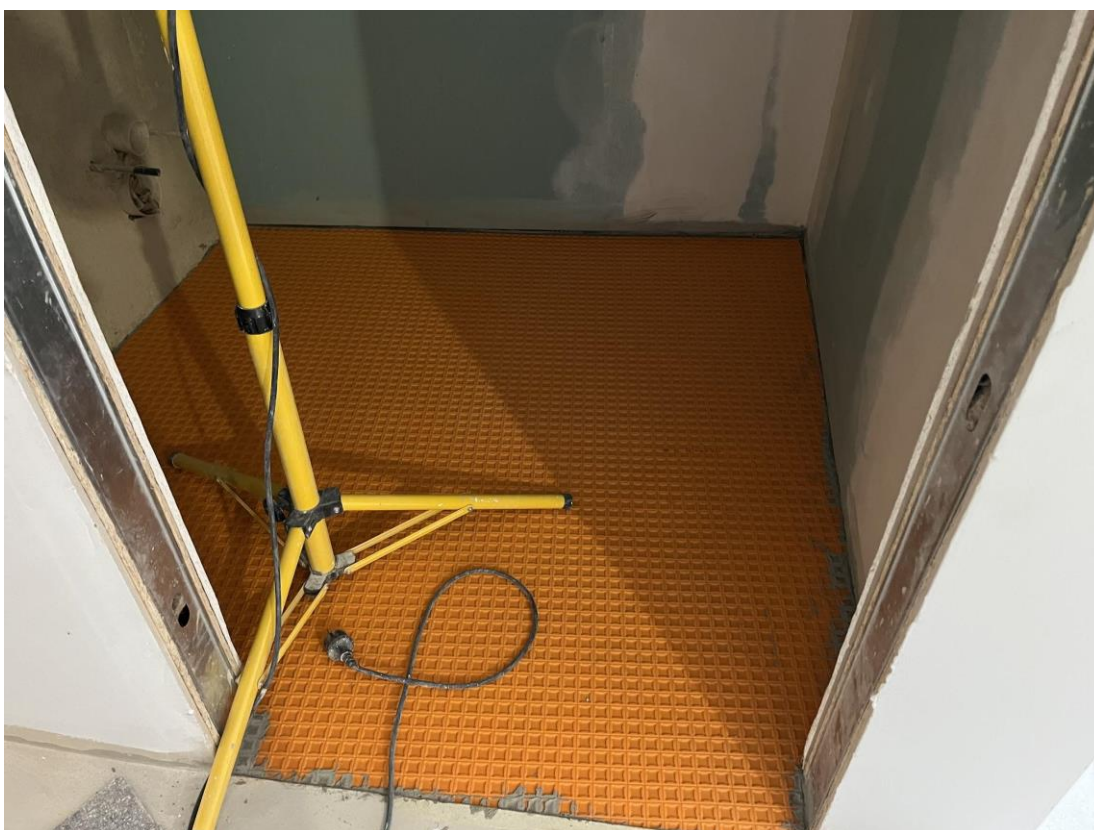

Project: Rua do Passadiço 55, Lisboa

Report Number: Passadiço - 25

同時，建築工人開始對底層以上公寓的浴室區域進行防水處理，為接下來的鋪砌瓷磚階段做準備。
