

## 施工进度报告

月度报告

2024 年 5 月

建筑商

LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto


## 当前进程


工程概述

1. 镀锌
2. 绝缘装置
3. 建设基础建设

## 工程照片



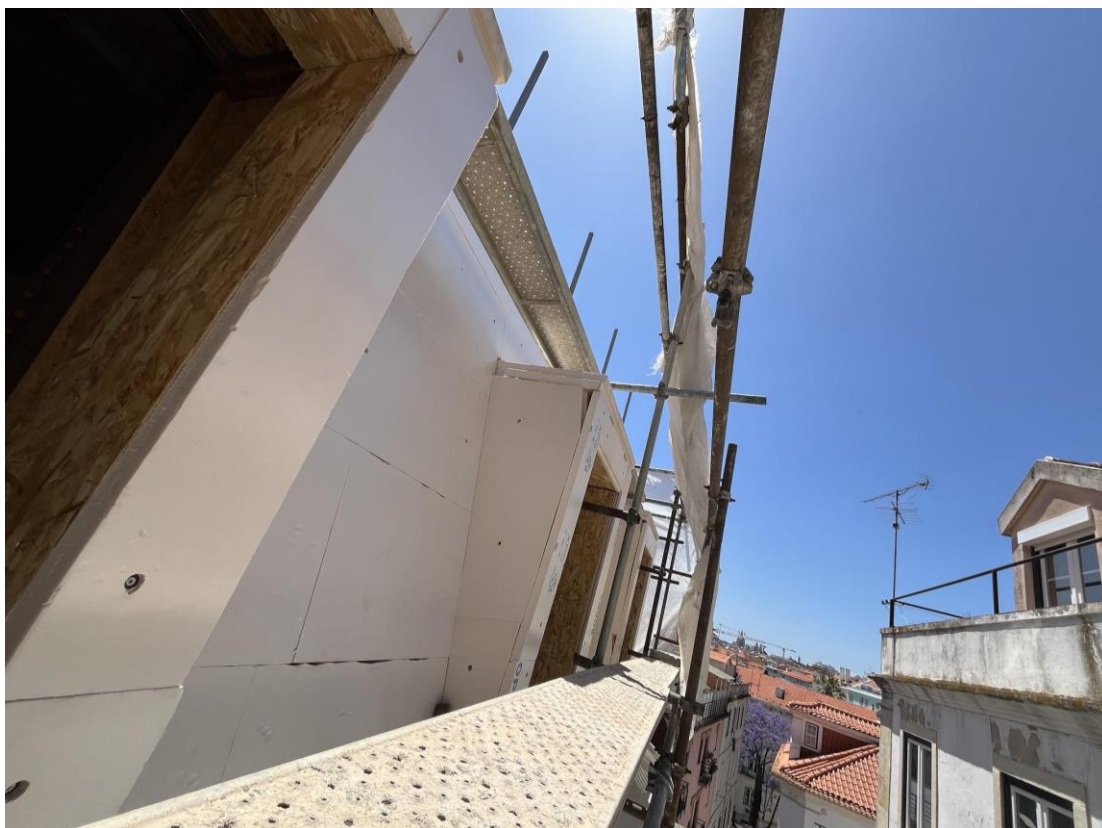

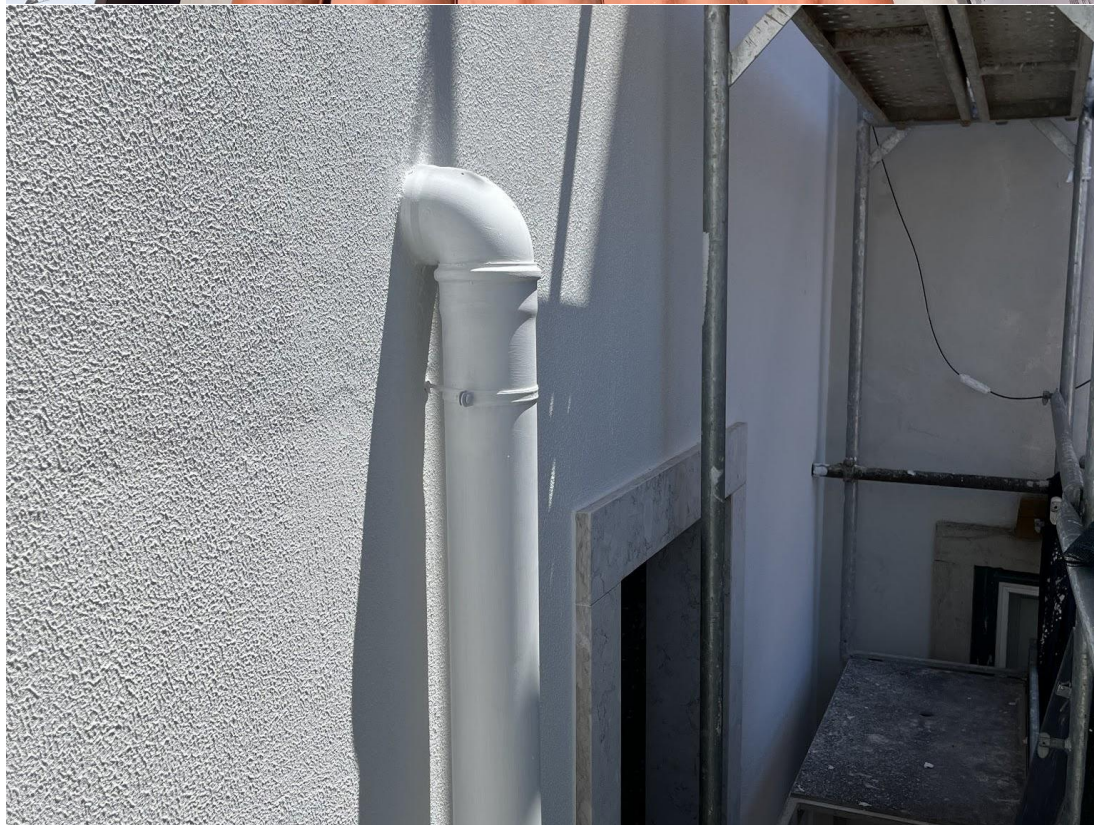


五月，建筑商继续对屋顶进行镀锌。在完成面向花园一侧的锌覆盖和屋顶瓦片后，他们开始将立面和外墙漆成白色。同时，他们也对面向前门的立面进行了施工，安装了镀锌层并放置了隔热材料。








在收到装置额外的隔热材料的指示之后，施工人员不仅开始在外墙上放置隔热材料，还在一楼公寓的内墙内放置隔热材料。然后，他们透过安装第二块面板完成了墙壁结构。

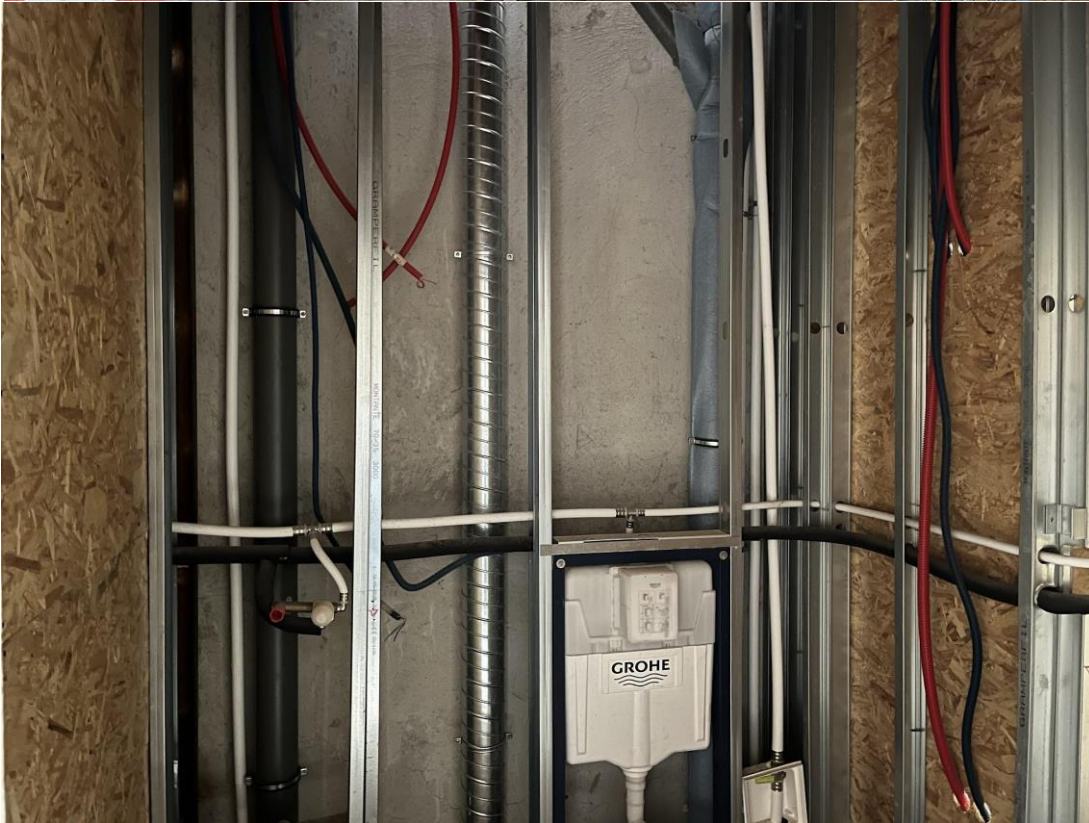

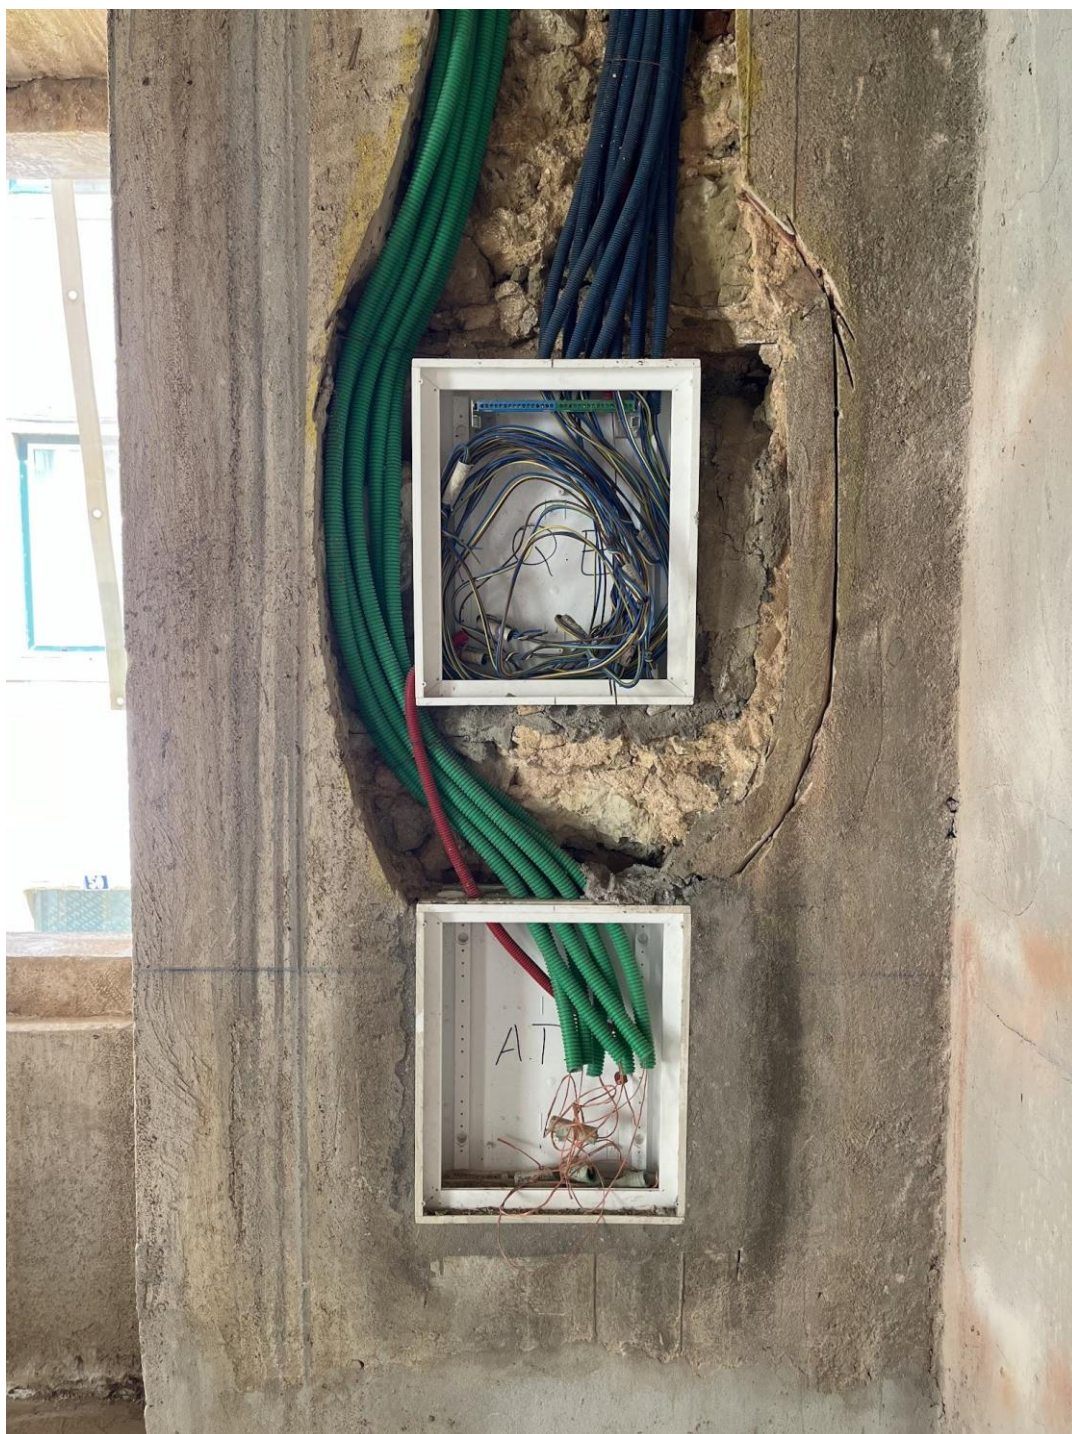









**Project:** Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

**Report Number:** Laurel - 27



**YAO TENG FGI**  
Property Development

---

4 月工程完成后，建筑商继续进行三楼和底层的电力基础设施安装工作。他们更在三楼安装了供水管系统。5 月底，他们进行了渗漏测试，以确保水管正常运作。此外，他们开始安装空调系统的基础设施。
