

Project: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

Report Number: Laurel - 27



YAO TENG FGI
Property Development

施工進度報告

月度報告 2024 年 5 月

建築商 LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto


當前進程


工程概述

1. 鍍鋅
2. 絕緣裝置
3. 建設基礎建設

工程照片



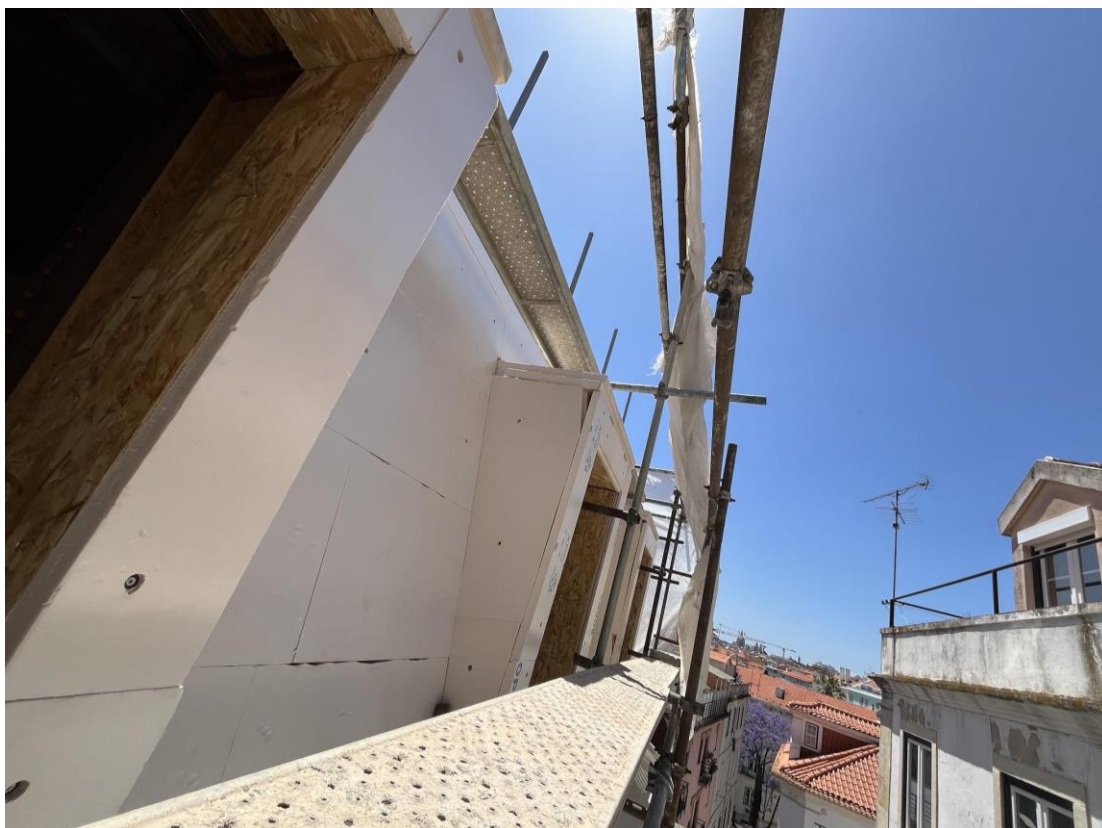

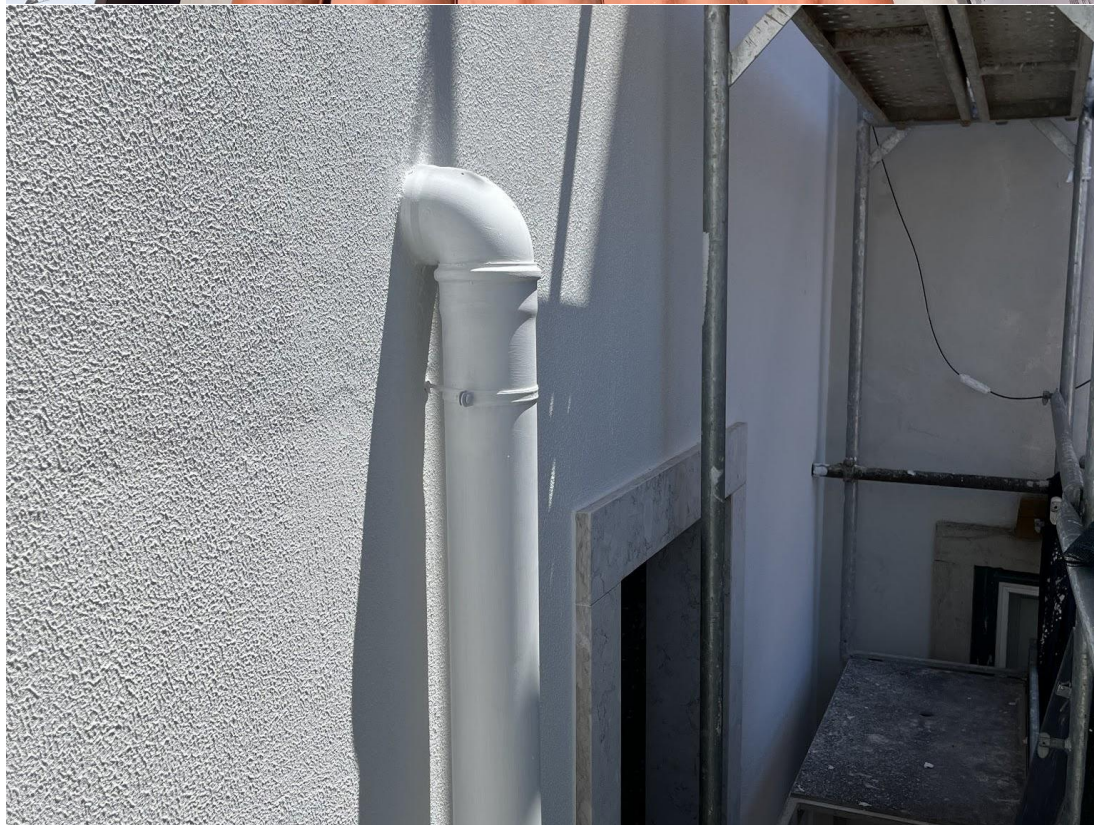


五月，建築商繼續對屋頂進行鍍鋅。在完成面向花園一側的鋅覆蓋和屋頂瓦片後，他們開始將立面和外牆漆成白色。同時，他們也對面向前門的立面進行了施工，安裝了鍍鋅層並放置了隔熱材料。







在收到裝置額外的隔熱材料的指示之後，施工人員不僅開始在外牆上放置隔熱材料，還在一樓公寓的內牆內放置隔熱材料。然後，他們透過安裝第二塊面板完成了牆壁結構。

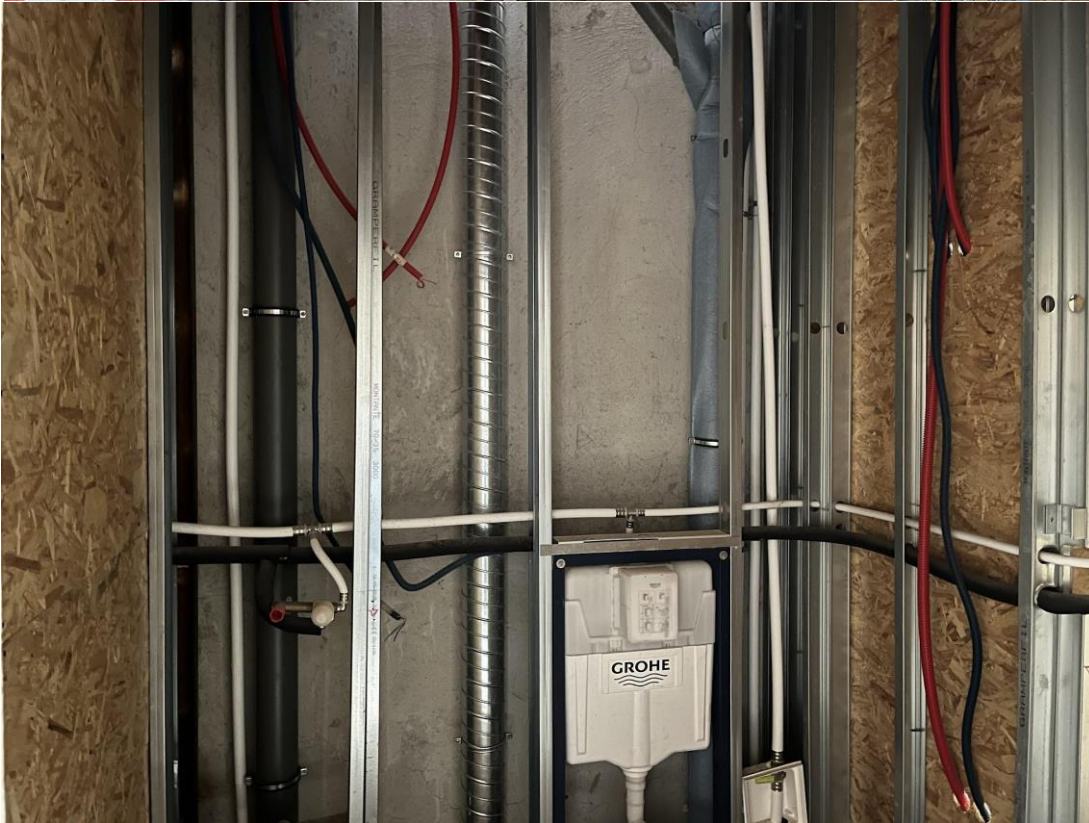









Project: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

Report Number: Laurel - 27



YAO TENG FGI
Property Development

4 月工程完成後，建築商繼續進行三樓和底層的電力基礎設施安裝工作。他們更在三樓安裝了供水管系統。5 月底，他們進行了滲漏測試，以確保水管正常運作。此外，他們開始安裝空調系統的基礎設施。
