

Project: Rua do Passadiço 55, Lisboa

Report Number: Passadiço - 27



YAO TENG FGI
Property Development

施工進度報告

月度報告 2024 年 6 月

建築商 NS Reformas, Construcción Y Trading S.L.Uz

當前進程

工程概述

1. 安裝淋浴盤
2. 安裝門窗
3. 屋頂瓦片及欄桿組裝
4. 安裝雨水排水管

工程照片



Project: Rua do Passadiço 55, Lisboa

Report Number: Passadiço - 27



YAO TENG FGI
Property Development





如之前的報告中所提到的，建築商已經完成了單位浴室區域的防水工作，並開始為浴室的地板和牆壁貼上磁磚。六月，他們為名邸壹號計畫的所有單位鋪設浴室瓷磚並安裝淋浴盆。





Project: Rua do Passadiço 55, Lisboa

Report Number: Passadiço - 27




YAO TENG FGI
Property Development







5 月份，建造者們專注於修復現有石窗框，並準備窗戶安裝。訂製的門窗是在專業工場生產的。六月收到貨後，施工人員開始安裝。

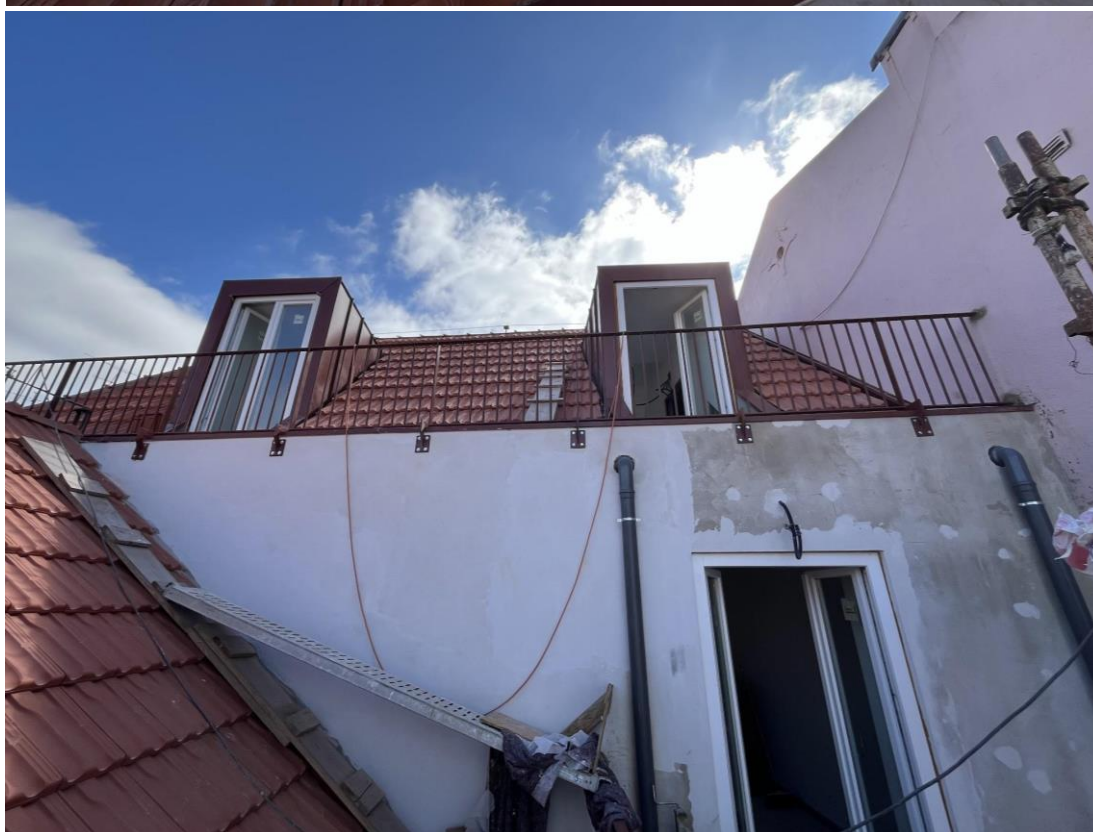



Project: Rua do Passadiço 55, Lisboa

Report Number: Passadiço - 27



YAO TENG FGI
Property Development

在 6 月，完成安裝屋頂瓦片。隨後，建築商在頂層屋頂上組裝欄桿。同時，他們開始沿著外牆安裝風暴和雨水排水管。
