

Project: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

Report Number: Laurel - 28



YAO TENG FGI
Property Development

施工进度报告

月度报告

2024 年 7 月

建筑商

LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto

当前进程

工程概述

1. 继续保温放置
2. 开始放置石膏板
3. 将背板放置在地板上
4. 放置窗户
5. 继续镀锌
6. 拆除现有楼梯


工程照片

Project: Rua Nova do Loureiro 43-45, Lisboa

Report Number: Laurel - 28



YAO TENG FGI
Property Development

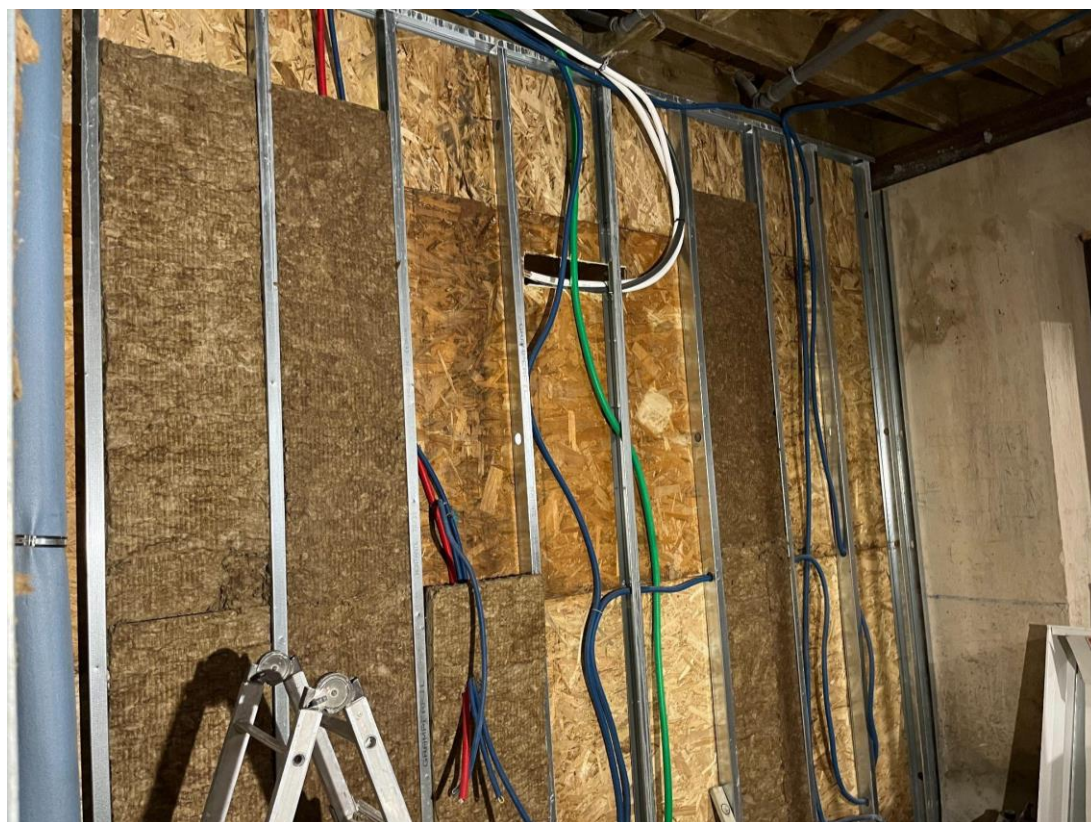










如同六月报告所述，施工团队正在一楼和二楼的内墙内安装隔热材料。七月，他们继续这项工作，在一楼和三楼的墙壁上放置了隔热材料。一旦基础设施和隔热层被第二层木镶板包围，他们就开始在一楼的内墙和外墙安装石膏板。

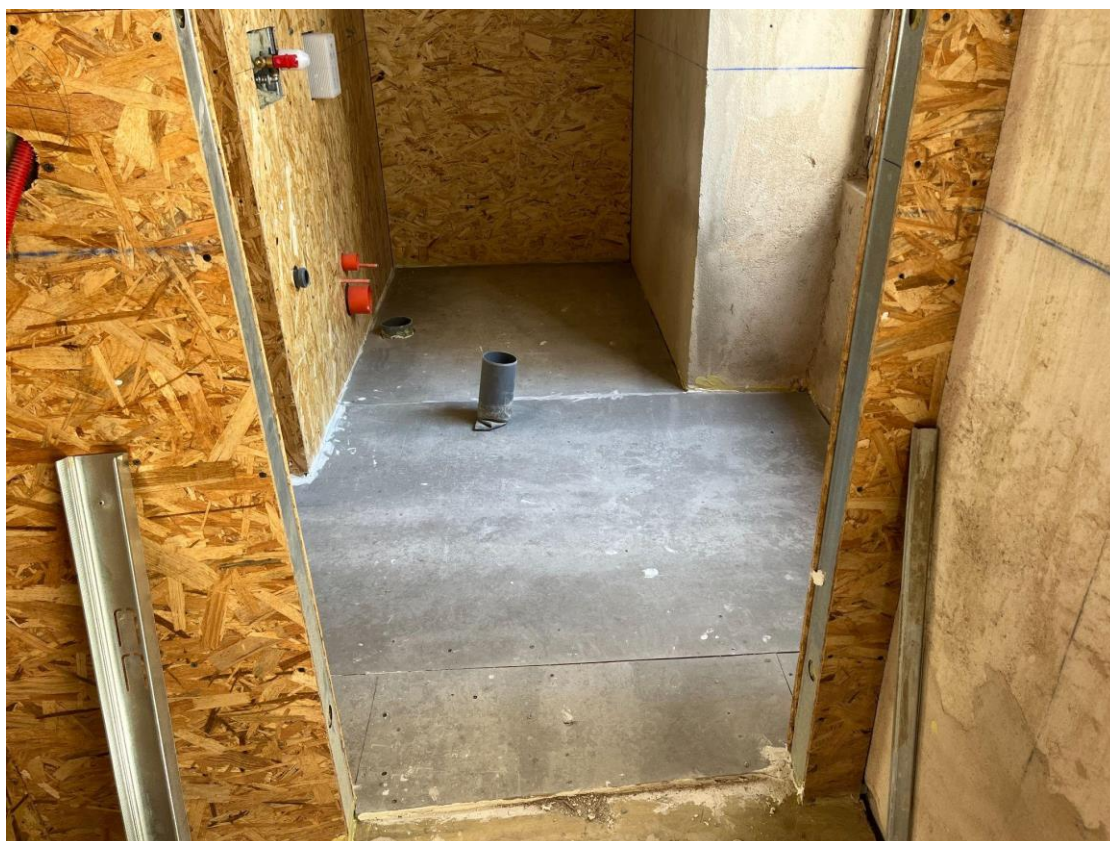






此外，他们开始在公寓厨房和浴室区域的地板上安装背板。此背板作为可见表面下方的额外层，形成底层地板结构的一部分。它有助于提供稳定性、防止瓷砖开裂、平整表面并减少声音。



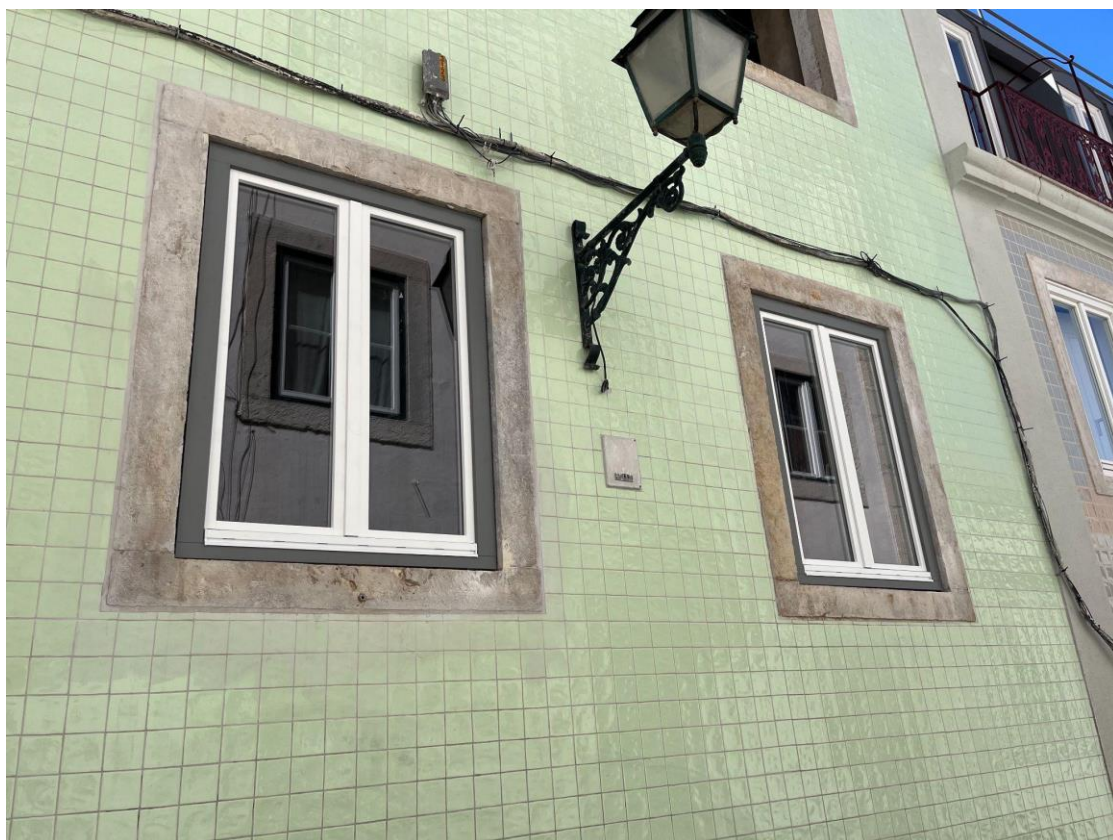




正如先前的报告所述，部分客制化窗户已于7月初生产并交付到现场。施工队已开始在一楼和三楼公寓安装窗户。





继六月的工作之后，建筑商继续在面向街道的一侧进行锌覆层和屋顶瓦片的进展，并在外观上放置隔热材料。



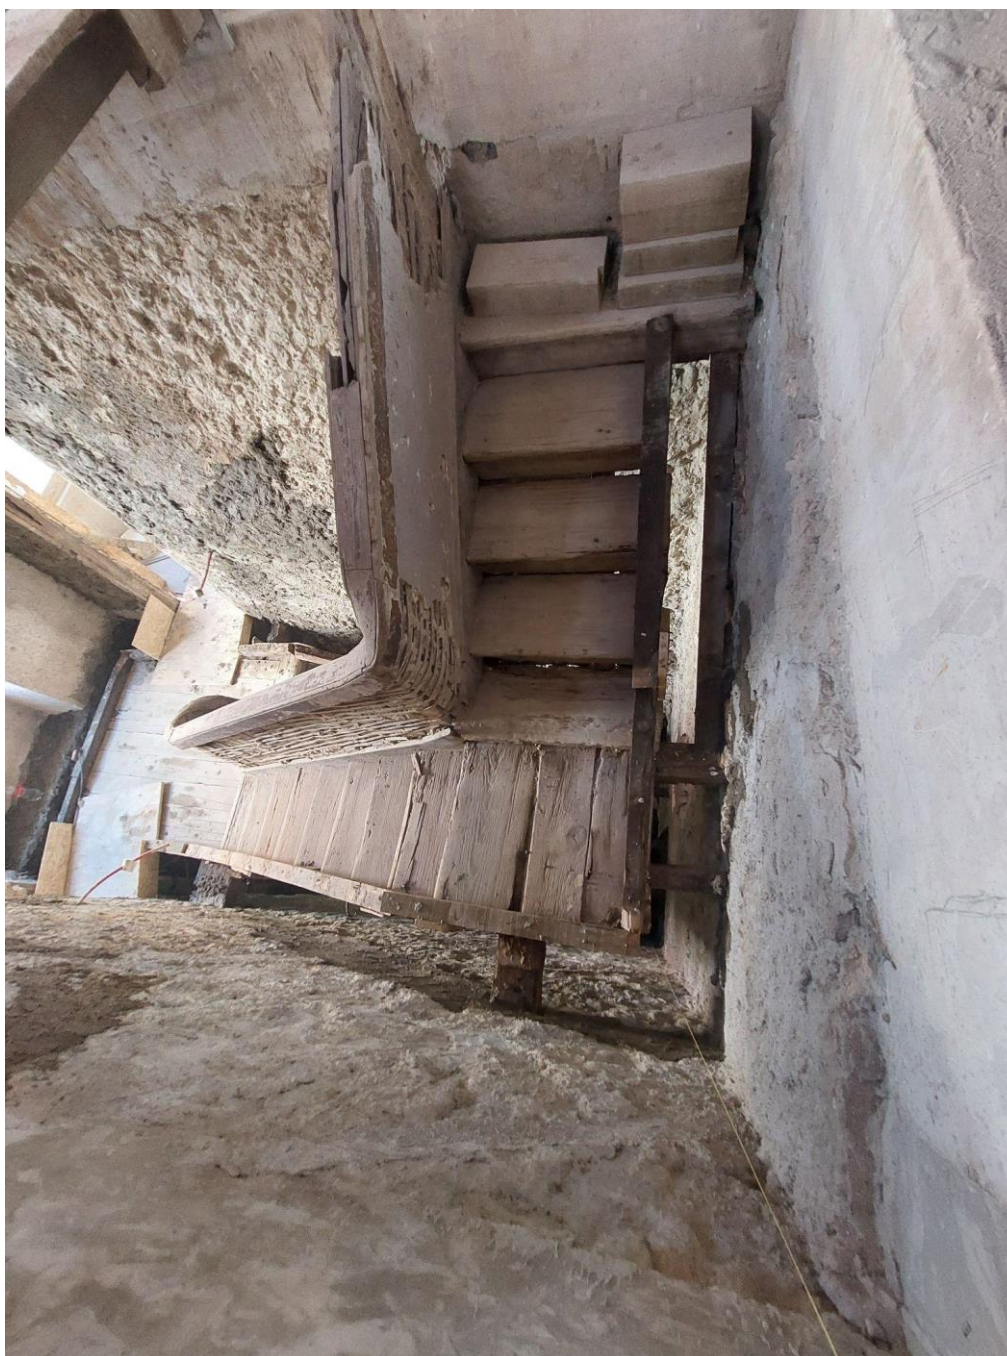

7月，施工队开始拆除现有木楼梯。同时，他们拆除了现有墙壁上的旧灰泥，并应用了加固灰泥。随后，他们开始平整墙壁。
