

## 施工进度报告

月度报告

2024 年 7 月 和 8 月

建筑商

LADRILLO S.A - Construção, Remodelações e Projecto

## 当前进程

工程概述

1. 完成屋顶底瓦
2. 一层铺装钢结构组装
3. 外墙保温屋顶工程

## 工程照片
























正如先前报告中提到的，施工团队的重点是屋顶。他们成功地完成了屋顶钢结构面板的安装，并开始在这些面板上放置子瓦材料，为七月和八月的最后瓦片做准备。随后，他们从八月开始在屋檐上贴磁砖。







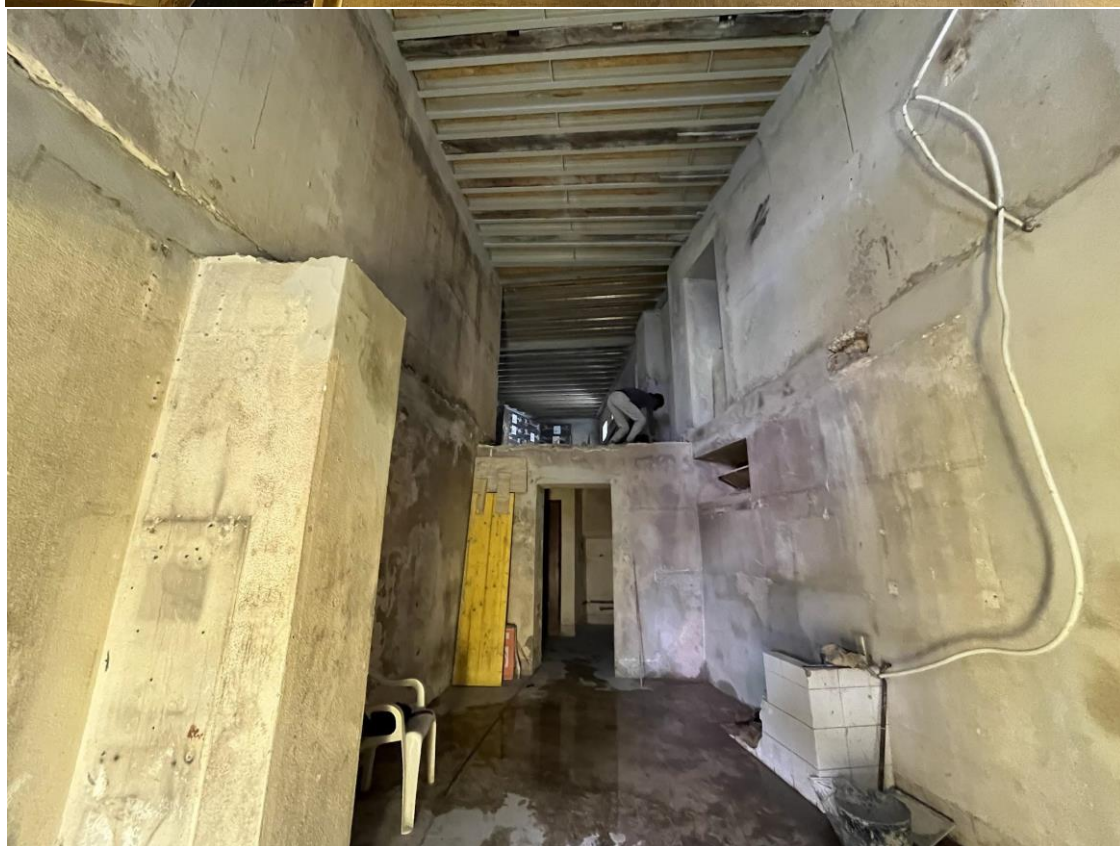








8 月，施工队拆除了底层路面和墙壁剩余的非结构部分。随后，他们开始组装一楼剩余路面的钢结构。





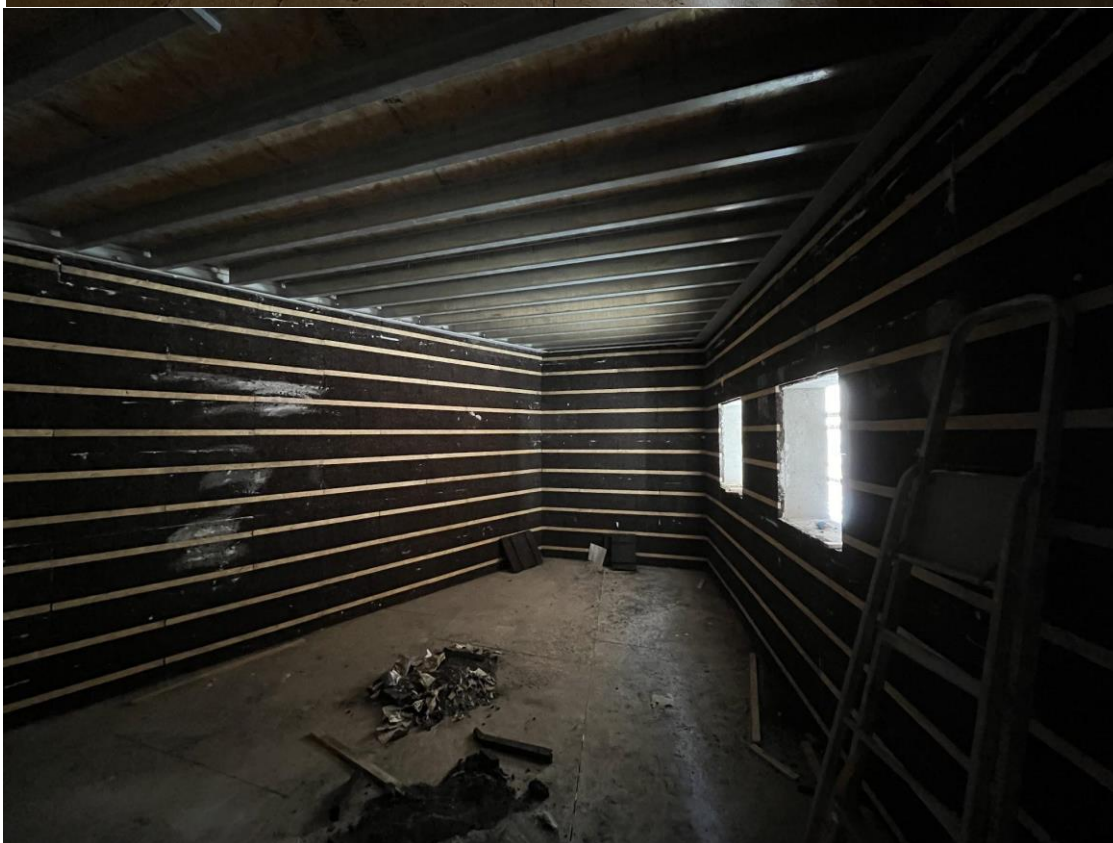







**Project:** Largo Rodrigues de Freitas no 4 e 5 e Beco da Lage no 4, 1100-455 Lisboa

**Report Number:** Freitas - 24



---

同时，7 月底保温材料运抵工地后，施工队开始外墙保温安装。此安装依序在 1、2、3 楼进行，以增强建筑物的隔热、隔音效果。
